

Silniční konference 2025


10.–11. 9. 2025, Výstaviště Brno

Ing. Radek Mátl
generální ředitel ŘSD




Čerpání rozpočtu v letech 2015–2024 (mld. Kč)

○ Rozpočet ○ Čerpáno

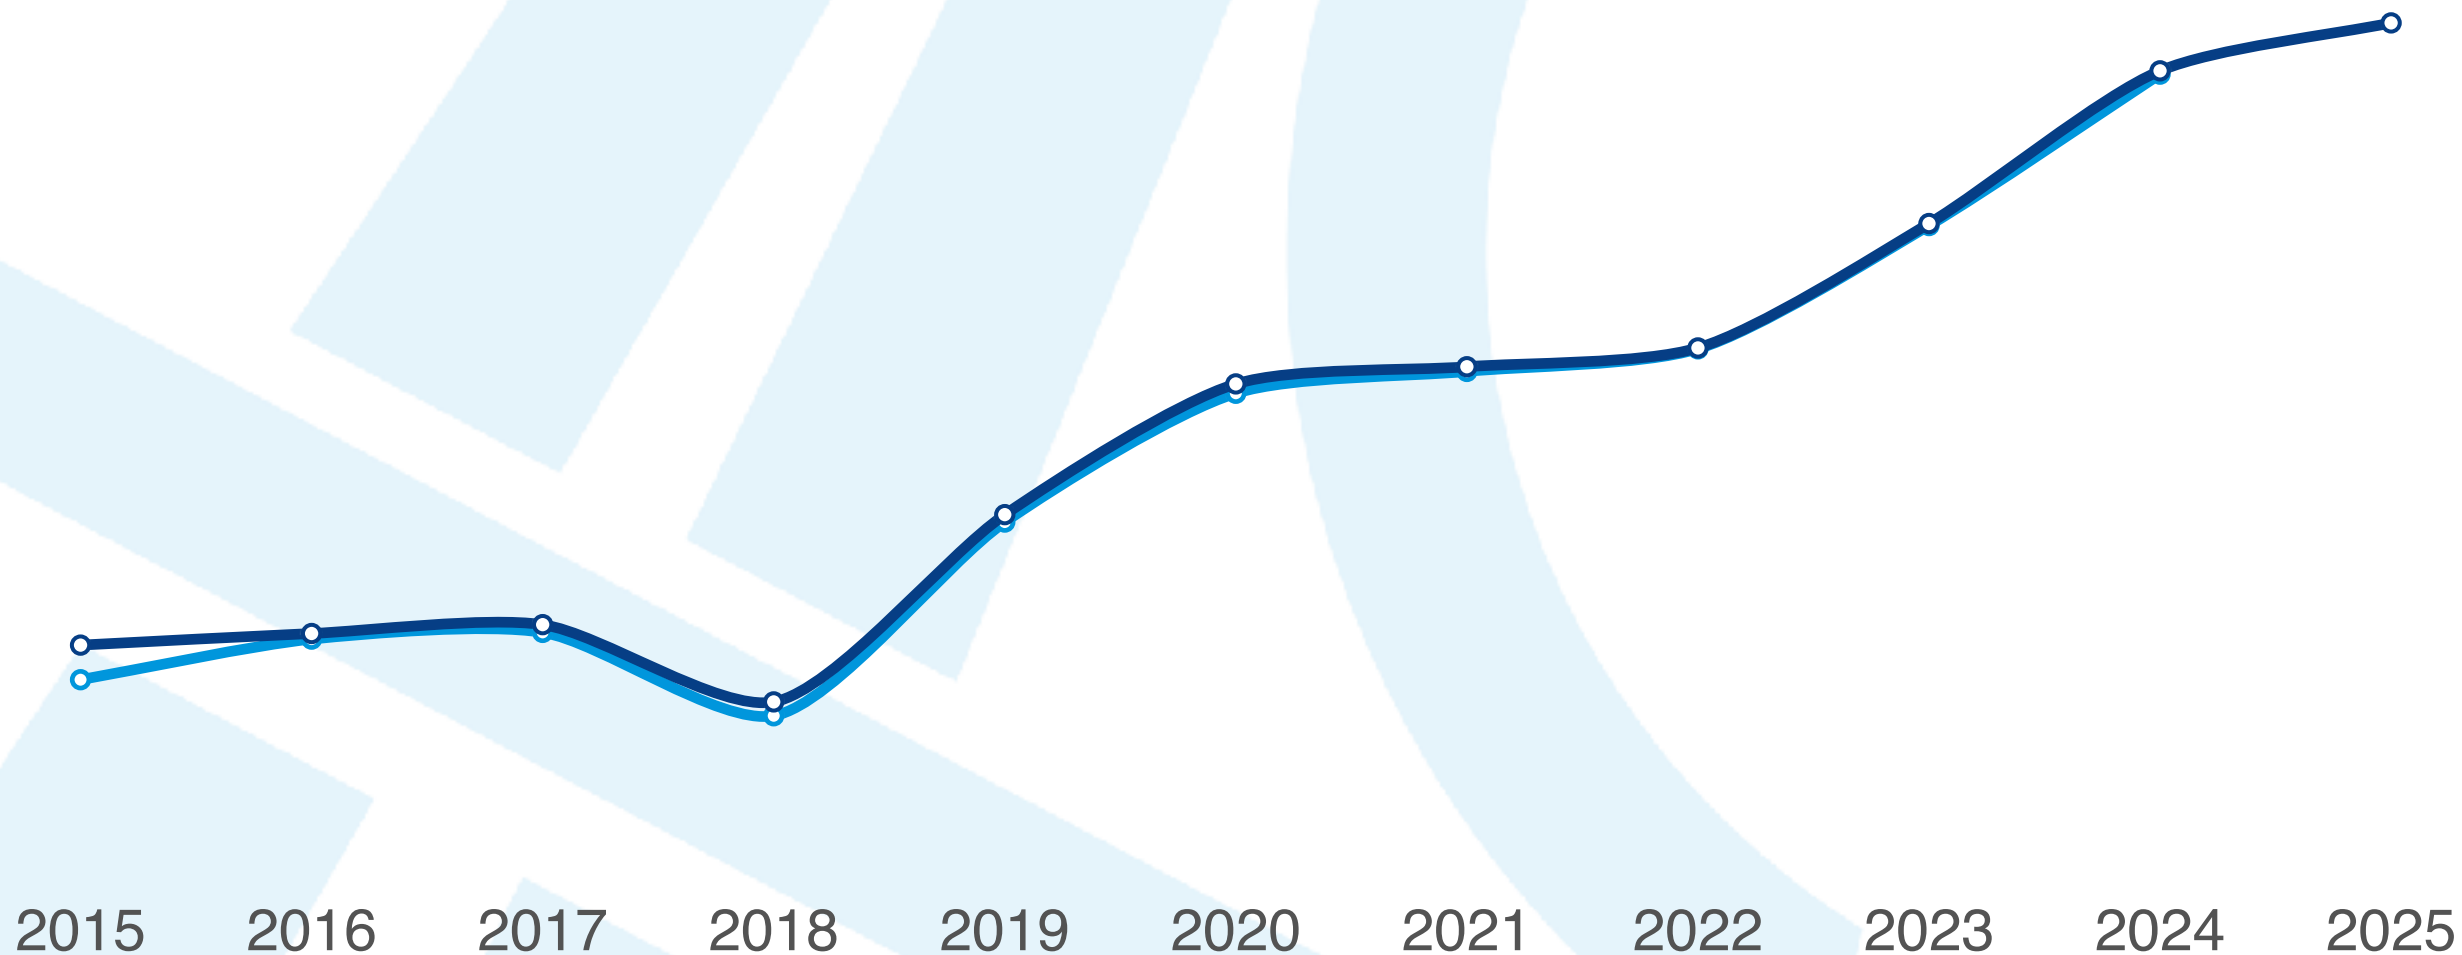

Příprava staveb v letech 2010–2025 (mld. Kč)

○ Plán ○ Čerpání

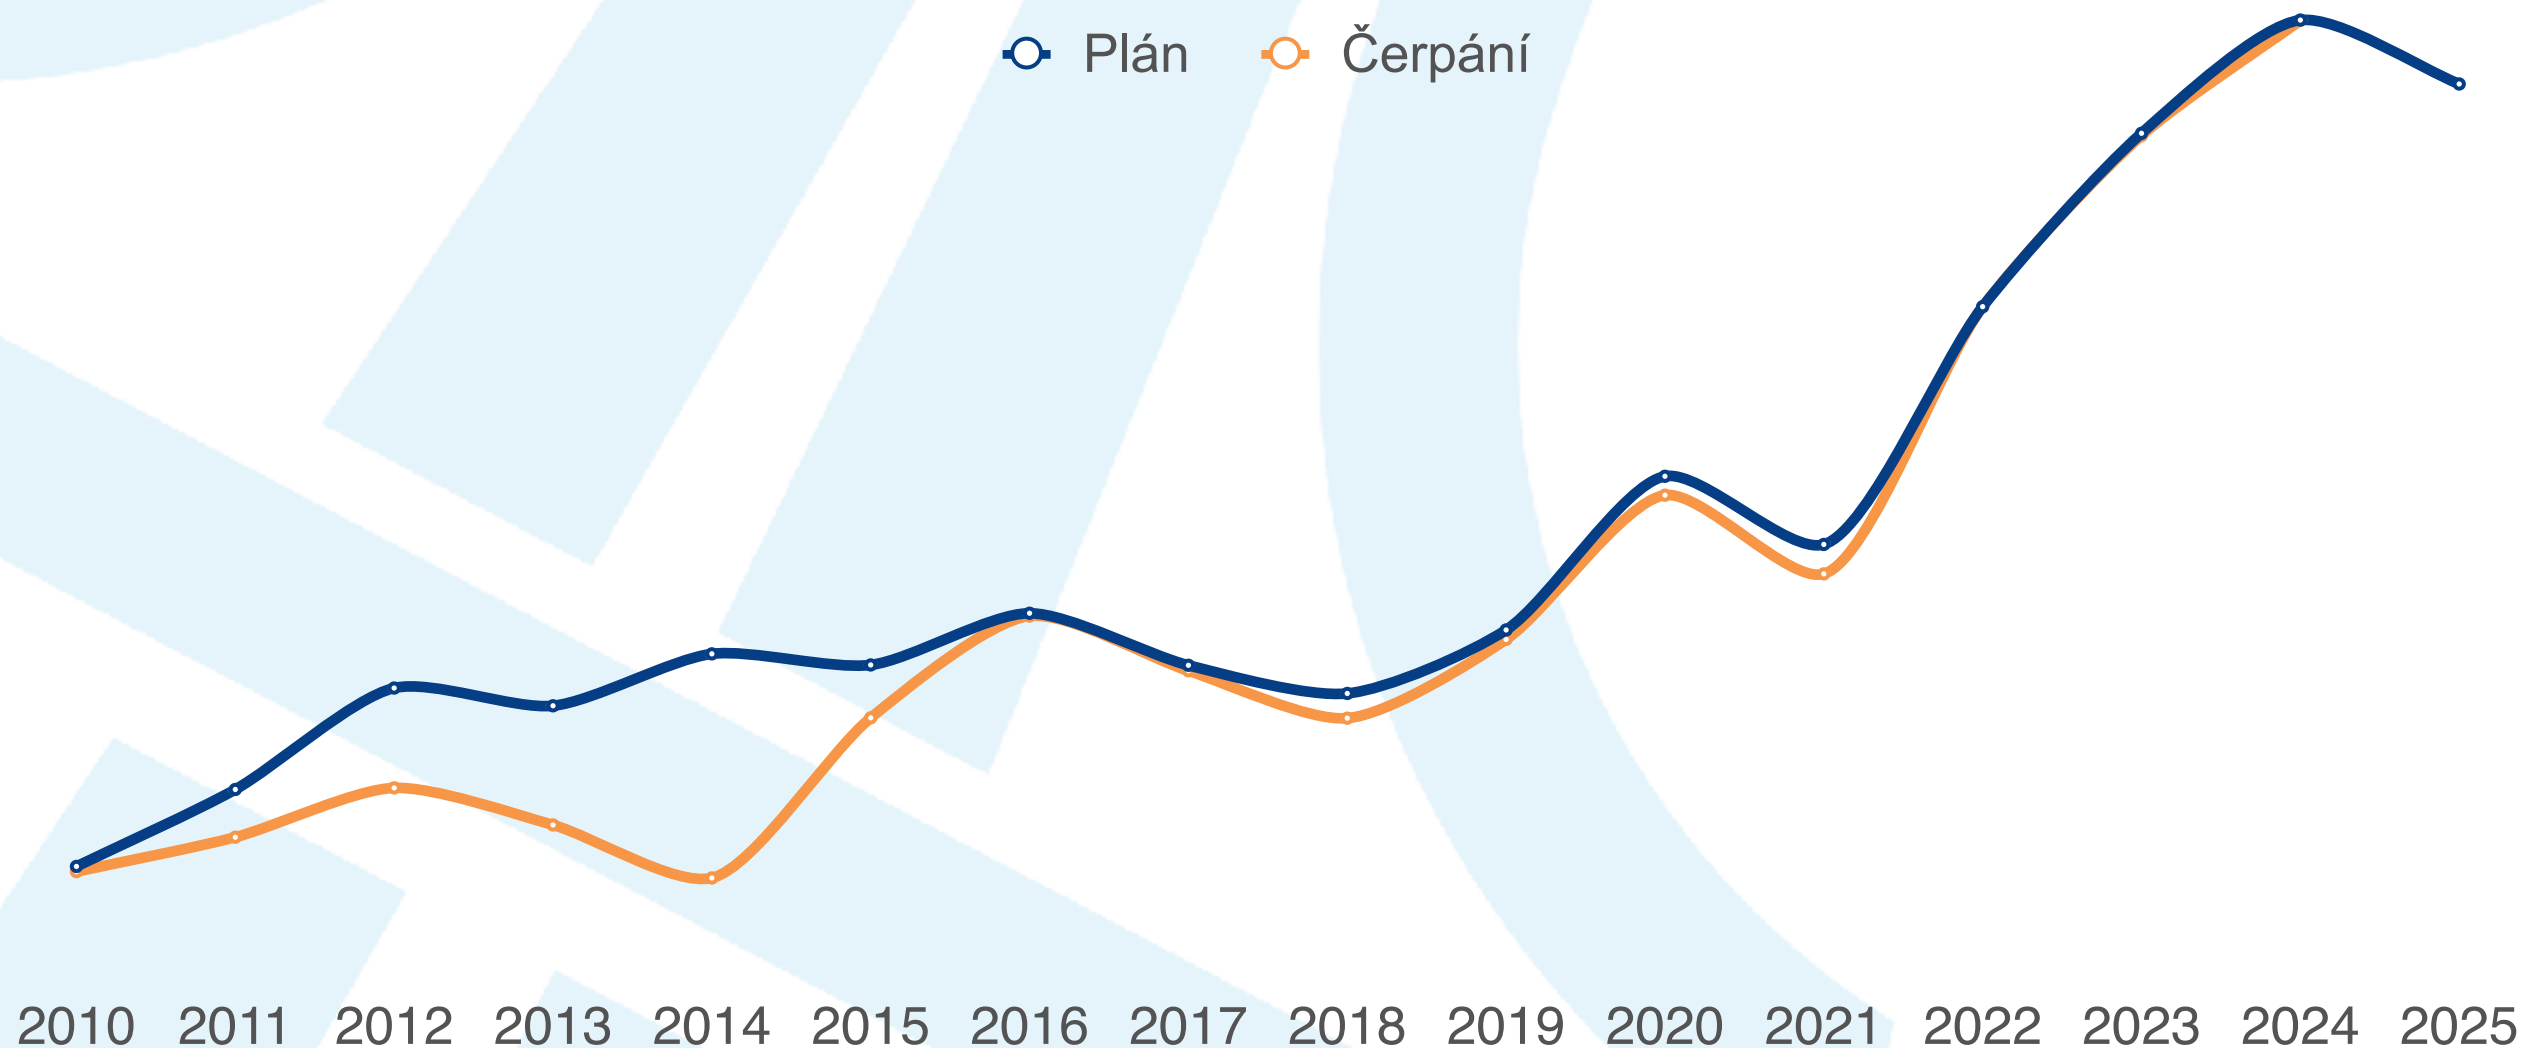


Projekty OPD

2021 – 2027

Prioritní osa	Alokace – aktuální hodnota (tis. Kč)	Předloženo v projektových žádostech (tis. Kč)	%	Schváleno vydáním schvalovacího protokolu (tis. Kč)	%	Prostavěno z alokace (předpoklad do konce roku 2025)	%
FS - TEN-T	51 073 000	50 728 152	99,32%	38 169 399	74,73%	41 474 920	81,21%
ERDF mimo TEN-T	6 835 000	10 628 027	155,49%	7 705 422	112,73%	5 898 290	86,30%

Projekty OPD3

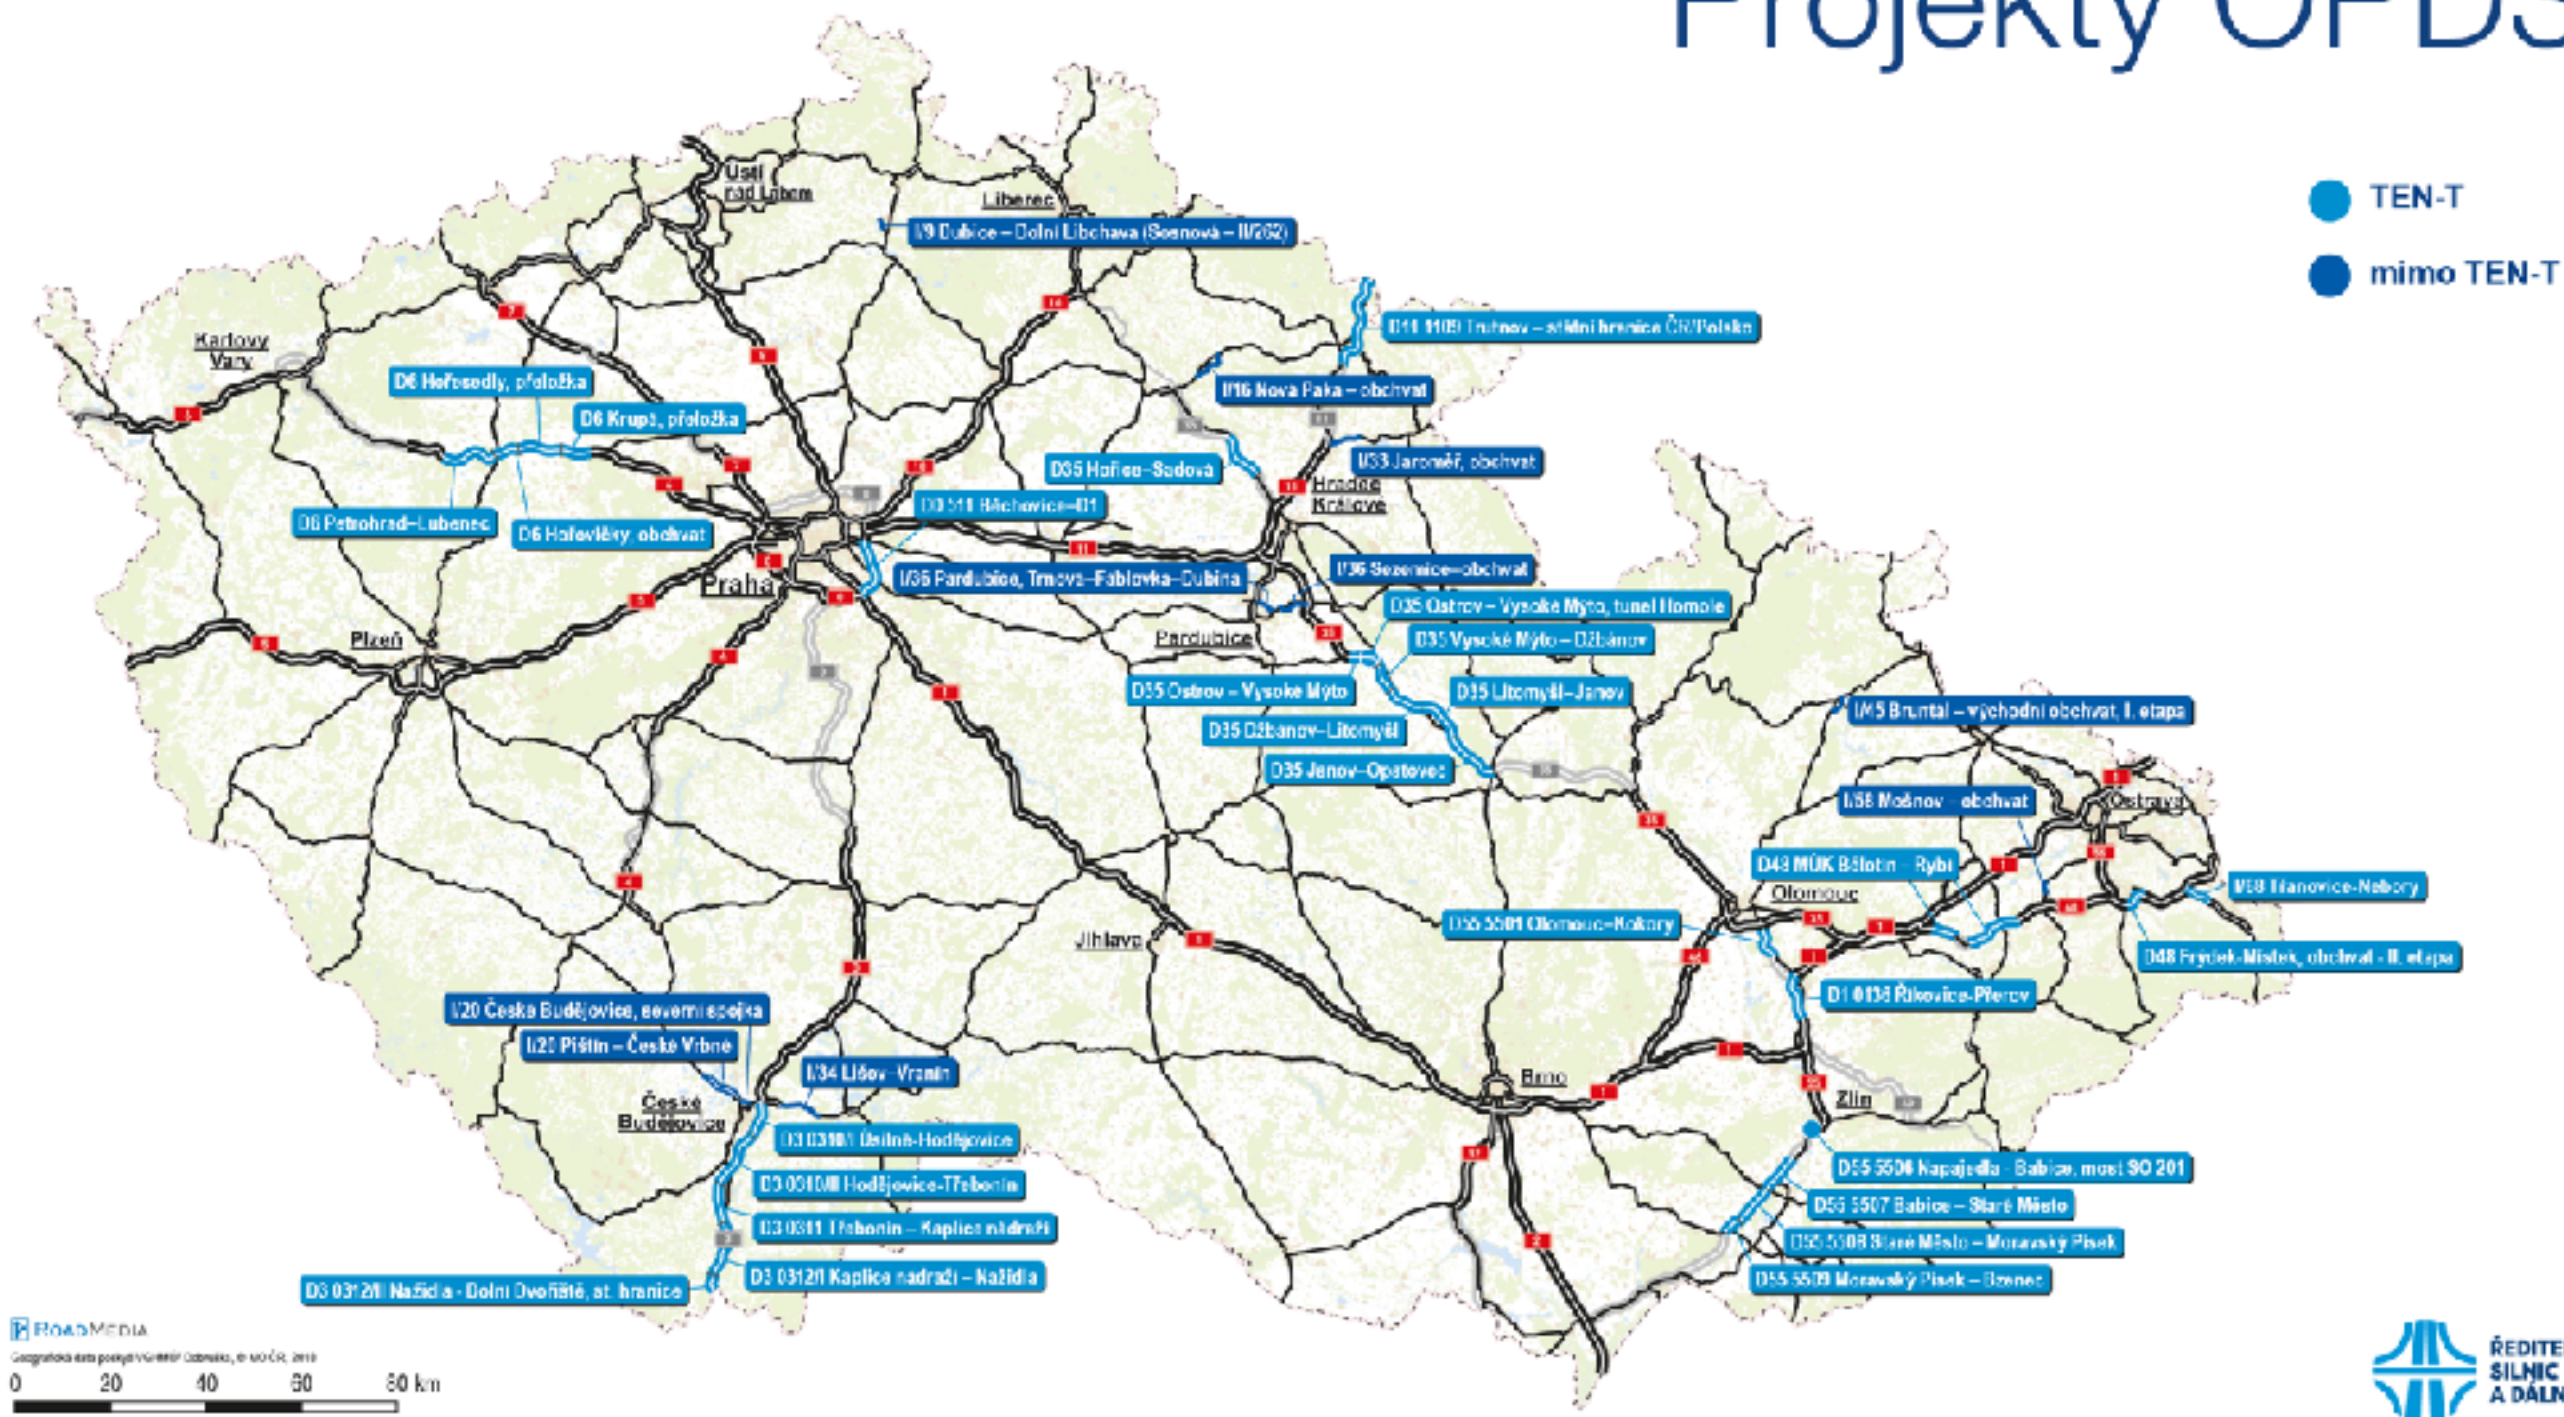

Provozní platba

Výše provozní platby (tis. Kč vč. DPH)

2024	2025	2026 (plán)
21 449 886	21 506 906	22 323 846

Plnění požadavků smlouvy SFDI

Vozovky GPI	dálnice	limit 1,86 %	aktuálně 1,80 %
	silnice I. třídy	limit 2,26 %	aktuálně 2,23 %
Mosty stavební stav VI.	dálnice	limit 2 %	aktuálně 1,69 %
	silnice I. třídy	limit 4 %	aktuálně 2,75 %
Mosty stavební stav VII.		limit 0,1 %	aktuálně 0,06 %
Kontrolní jízdy	zatím bez sankce		



*V současnosti stavíme
téměř **277 km** nových
silnic a dálnic...*























Co stavíme...



ROADMEDIA

Geografická data poskytl VGHMÚP, © 2016

0 20 40 60 80 km

”

*V letošním roce je plán
zahájit výstavbu téměř
110 km a zprovoznit
skoro **100 km** nových
silnic a dálnic...*



Úsek D35
Litomyšl - Janov
R. č. 3000/22

STRABAG
fresta





Đá thiên thạch D6
Zalmanov - Krinice
14.08.2005

 sfdi
 SFTT

 SFTT
 SFTT

Silnice I/12
Běchovice - Úvaly
23. července 2025



SKANSKA



Silnice I/27
Plasy, most
16. června 2025





silniční
Nácho **bchvat**

11. březen 2025



www.sd.cz



ŘEDITELSTVÍ
SILNIC
A DÁLNIC

EUROVA






úlice I/46
Opava, železniční hradeček – Dlouhá
24. srpna 2025

 sfdi
Státní fond
rozvoje


 Ministerstvo
školy, mládeže
a tělovýchovy

 STRABAG

Co zahájíme v roce 2025

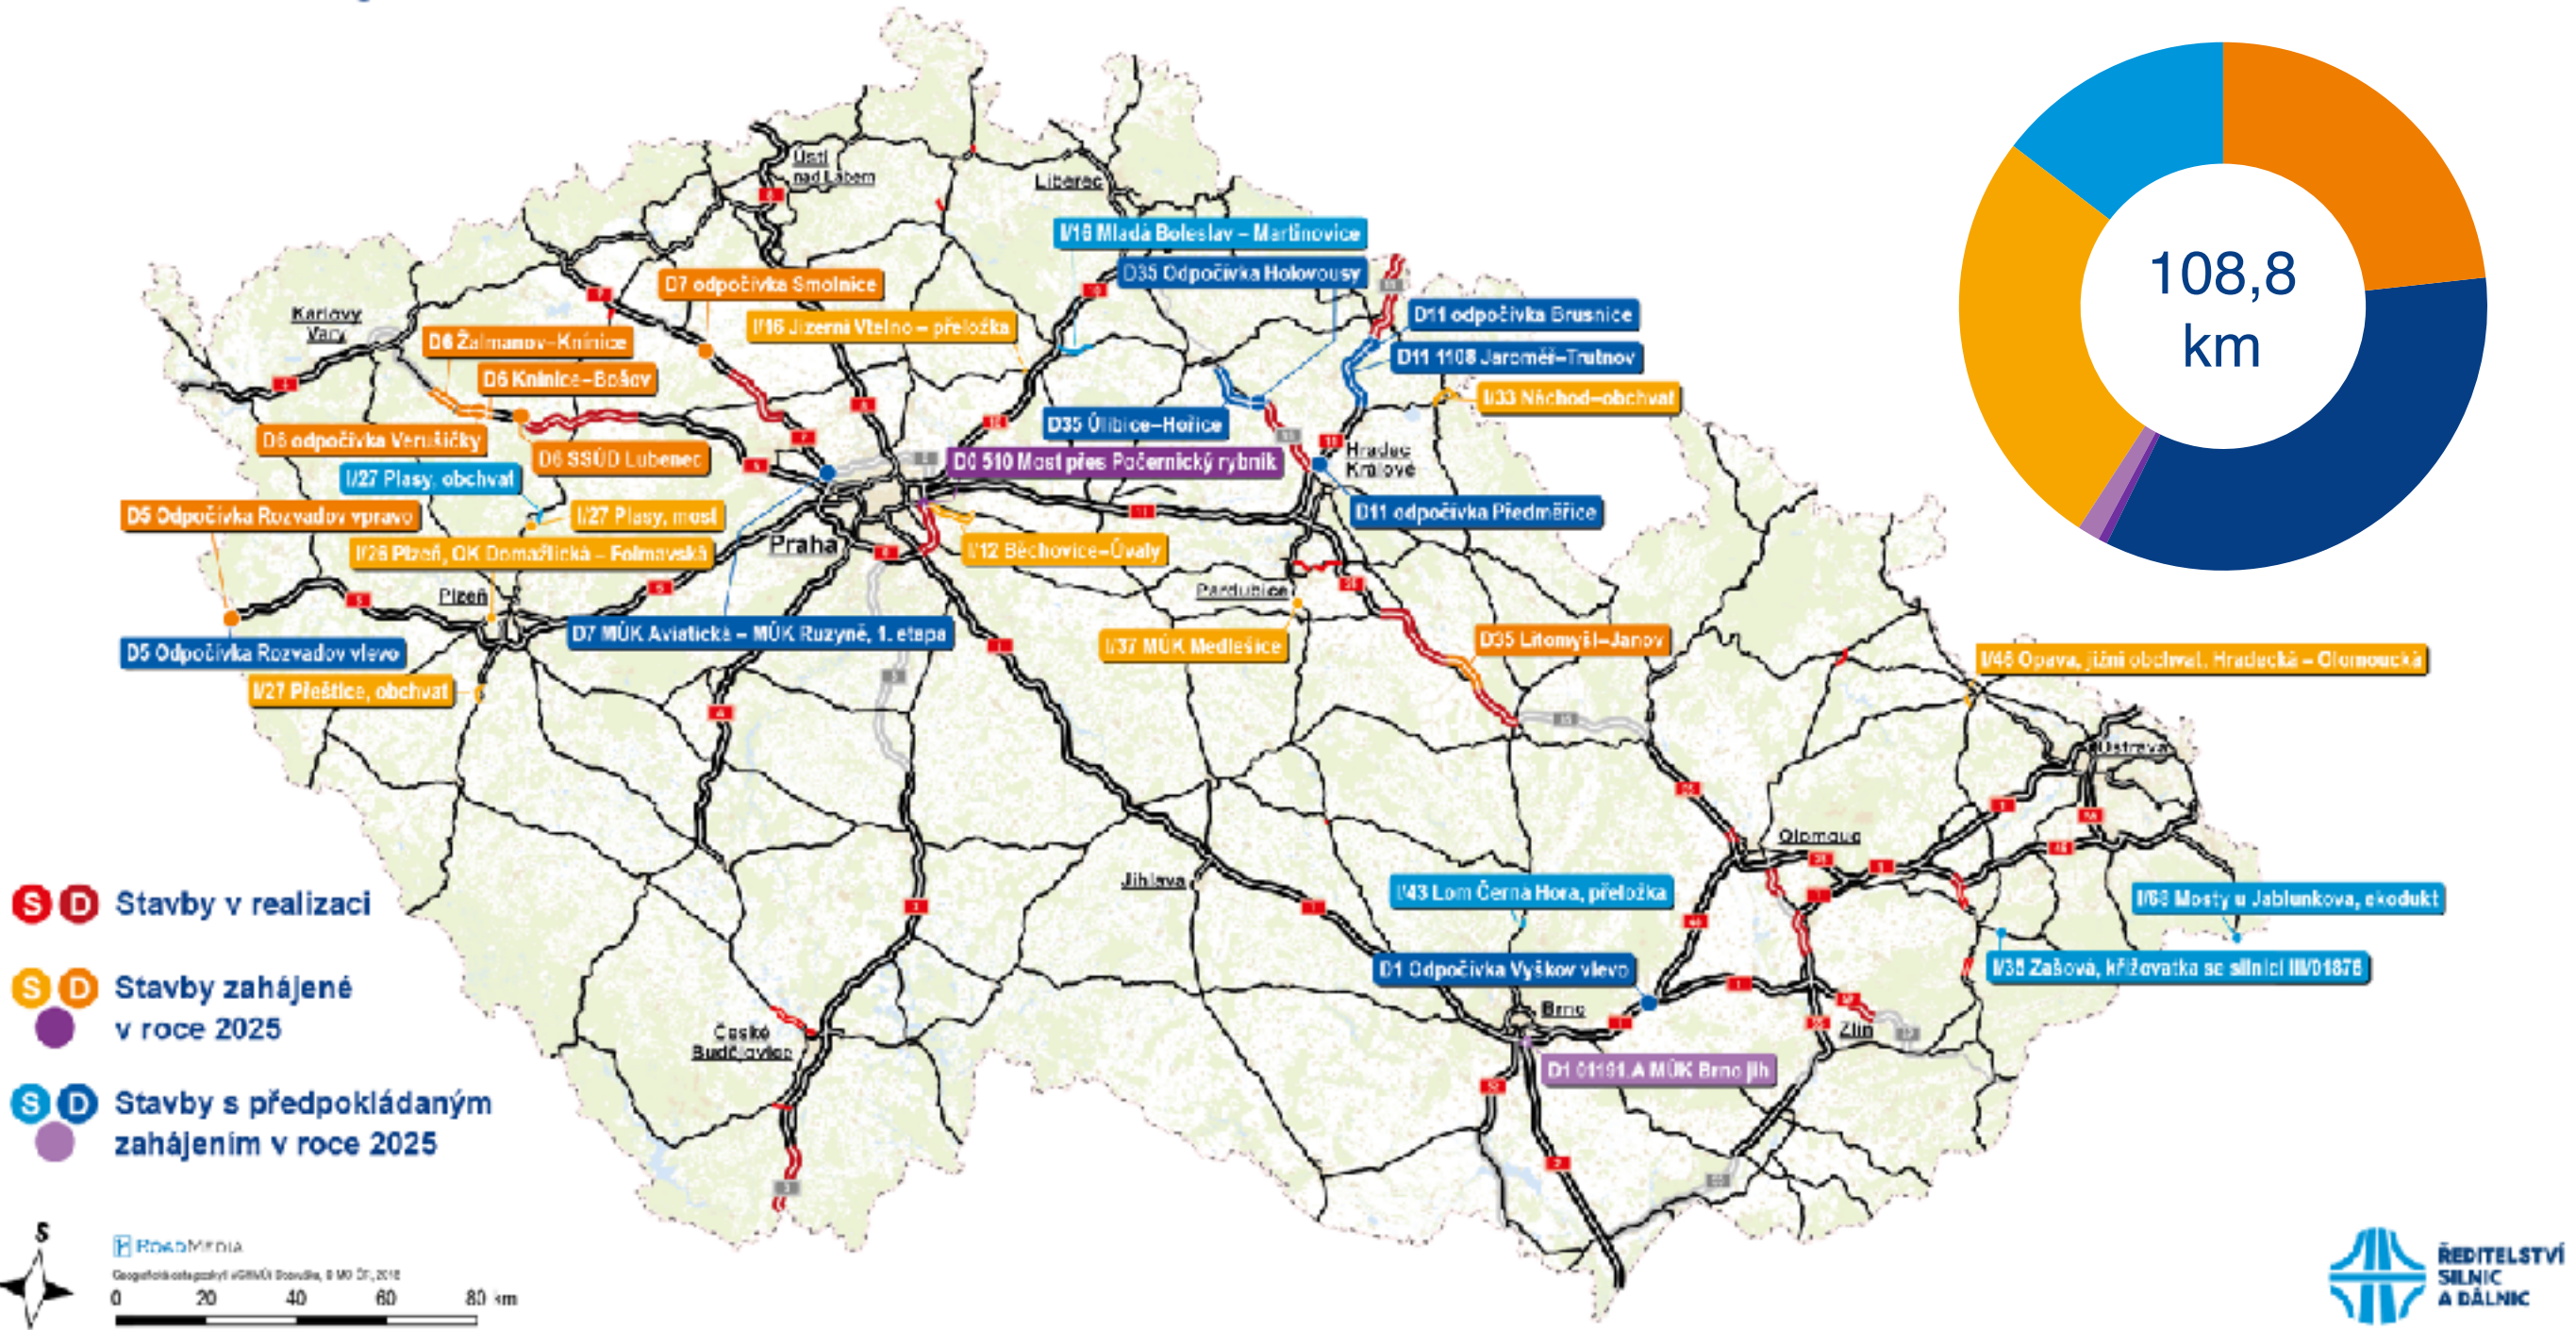

Co zprovozníme v roce 2025

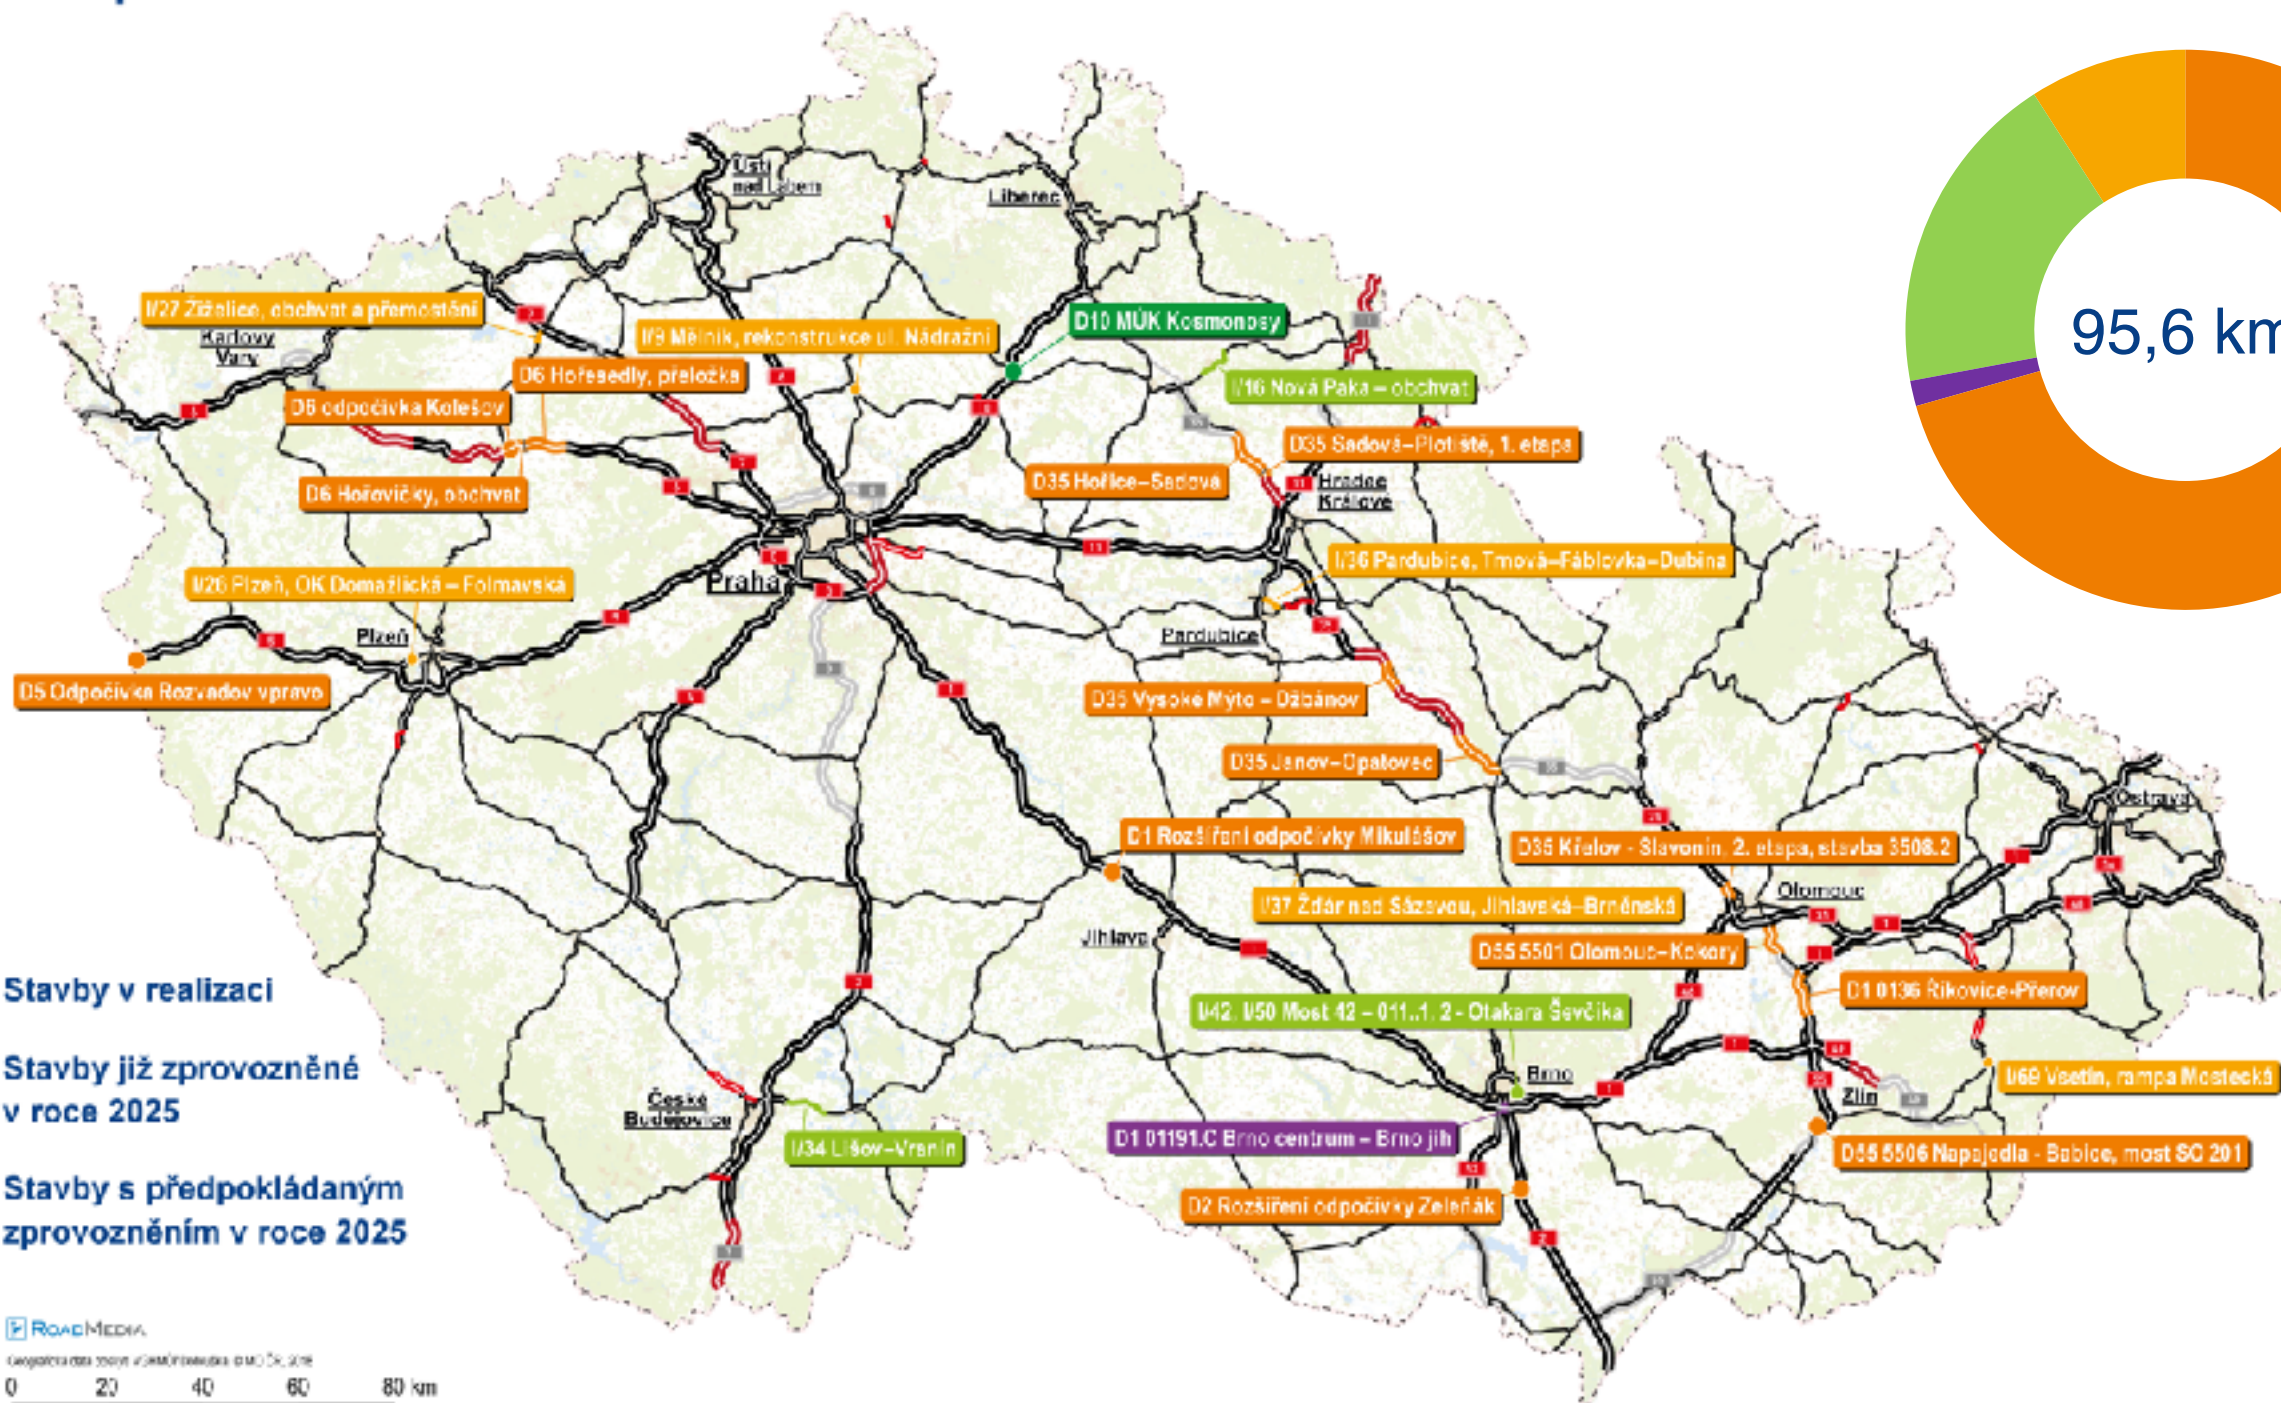

95,6 km



ROADMEDIA

Geografická data poskytl ÚHÚM, aktualizace 01.10.2018

0 20 40 60 80 km

Dálnice D1

 **ŘÍKOVICE - PŘEROV**

DOKUMENTACE STAVBY - SRPEN 2025



**ŘEDITELSTVÍ
SILNIC
A DÁLNIC**

rsd.cz

Soutěže na zhotovitele

Název stavby	Délka trasy (m)	Stavební náklady dle SoD (Kč bez DPH)	Poznámka
Fáze - hodnocení nabídek			
D7 MÚK Aviatická	1 080	938 098 000	
D11 1108 Jaroměř – Trutnov	19 630	13 000 000 000	
D35 Úlibice – Hořice	16 346	5 911 000 000	
I/16 Mladá Boleslav – Martinovice	8 200	1 703 200 000	
I/27 Plasy, obchvat	6 118	1 029 076 217	
I/43 Lom Černá Hora	2 060	388 000 000	
I/43 Závist, stoupací pruh	909	154 770 000	
Fáze - podání nabídek			
D3 SSÚD Kaplice vč. křižovatky a ZTV Samoty	-	559 300 000	Lhůta pro podání nabídky 16.10.2025
I/13 Rynoltice – Lvová, přeložka silnice	2 360	738 315 895	Lhůta pro podání nabídky 09.09.2025
I/19, I/34 Pelhřimov, obchvat	6 468	1 626 000 000	Lhůta pro podání nabídky 26.09.2025
I/20 Hněvkov – Sedlice	6 642	1 279 250 000	Lhůta pro podání nabídky 10.10.2025
I/53 Lechovice – Pohořelice	20 621	3 280 000 000	Lhůta pro podání nabídky 5.11.2025
I/57 Linhartovy	1 891	220 000 000	Lhůta pro podání nabídky 10.09.2025

Soutěže na zhotovitele

Název stavby	Délka trasy (m)	Stavební náklady dle SoD (Kč bez DPH)	Poznámka
V přípravě (zahájení zadávacího řízení do konce r. 2025)			
D0 510 most přes Počernický rybník	575	1 350 000 000	
D0 510 Satalice – Běchovice, zkapacitnění	2 766	1 670 393 000	
D0 MÚK Třebonice, 0. etapa	-	537 600 000	
D1 01313 Připojení BPZ Černovická terasa na D1	2 495	2 384 250 000	
D6 Karlovy Vary – Olšová Vrata	8 054	4 901 600 000	
D11 odpočívka Bernartice km 150,2 vpravo	-	425 150 000	
D11 odpočívka Jaroměř	-	766 661 800	FIDIC - YELLOW BOOK
D11 odpočívka Královec km 154 vlevo	-	315 500 000	
D35 Úlibice – obchvat	3 791	1 071 100 000	
D48 MÚK Bělotín – Rybí II. Etapa	3 815	1 004 200 000	
D55 5502 Kokory – Přerov	5 960	2 197 300 000	
I/2 Pardubice – JV obchvat	3 100	599 264 000	
I/3 Červené Vršky – U Topolu, uspořádání 2+1	3 078	2 113 000 000	
I/38 Znojmo obchvat I	3 037	363 155 000	
I/46 Šternberk, obchvat	4 708	2 037 000 000	
I/50 Bučovice, obchvat	5 570	2 053 300 000	FIDIC - YELLOW BOOK
I/55 Břeclav, obchvat	11 206	2 382 600 000	

Předpoklad zadání významných zakázek na projektové práce do konce roku 2025

Název stavby	Stupeň PD	Předpokládané datum zahájení VŘ na zpracovatele PD
D0 520 Březiněves – Satalice	DPS	hodnocení
I/17 Chrudim – severní obchvat	TES	podání nabídek
I/18 Křešice, přeložka	DPS	09/2025
D7 Postoloprty, zkapacitnění obchvatu	PDPS	4.Q 2025
I/9 Nový Bor – Dolní Libchava	DPS	3.Q 2025
D5 Třebonice – Loděnice, zkapacitnění	DPS	3.Q 2025
I/73 Bořitov – Svitávka	PDPS	3.Q 2025
D52 5205 Přejchod VN Nové Mlýny	DPS	3.Q 2025
I/38 Krchleby – Nymburk	DPS	3.Q 2025
I/38 Poděbrady – Kolín, přeložka	DPS	3.Q 2025
I/26 Holýšov, obchvat	DPS	4.Q 2025
I/26 Horšovský Týn, obchvat	DPS	4.Q 2025
D1 01312 MÚK Brno východ - MÚK Holubice	DPS	4.Q 2025
D4 SSÚD Mníšek pod Brdy	DPS	4.Q 2025
D20 Nová Hospoda – Jihlava	VST	4.Q 2025
D19 Domašov – Prostějov	VST	4.Q 2025

”

*V roce 2026 plánujeme
zahájit výstavbu téměř
152 km a zprovoznit **70 km**
nových silnic a dálnic...*







I/34 Lišov – Vranín



Spolufinancováno
Evropskou unií

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



15. července 2025



ŘEŠENÍ
SIL
A D





M-SILNICE

80

80

60















Co plánujeme zahájit v roce 2026

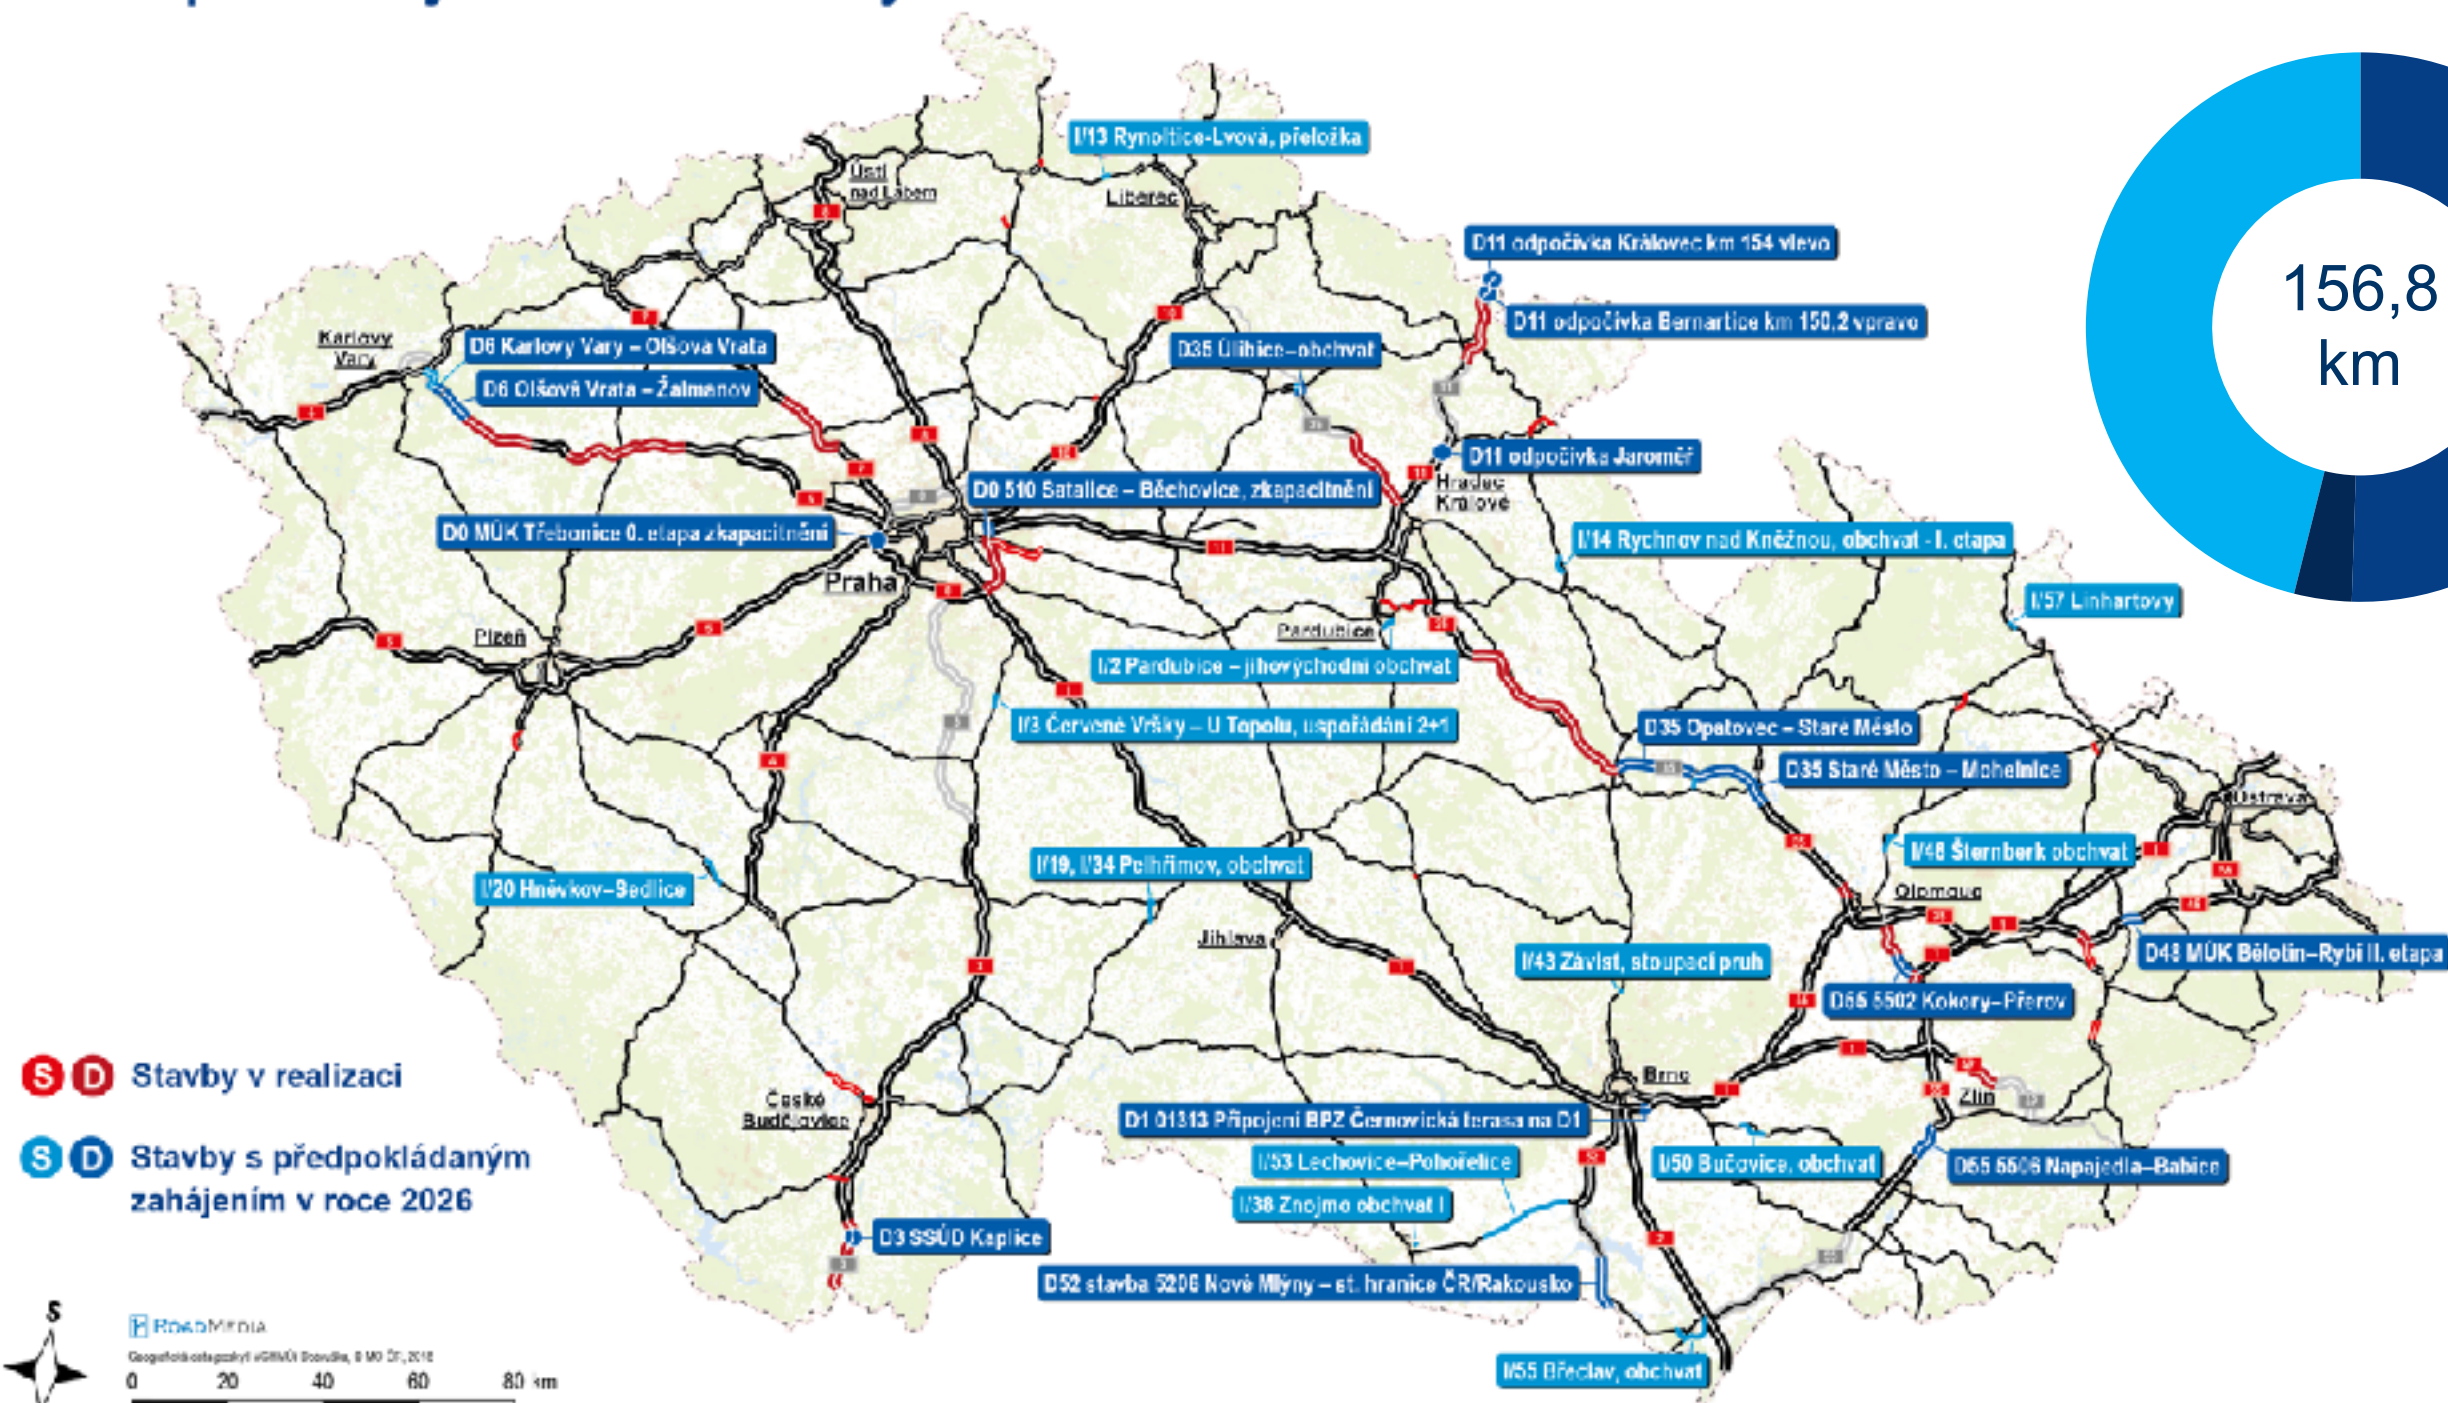

Co zprovozníme v roce 2026

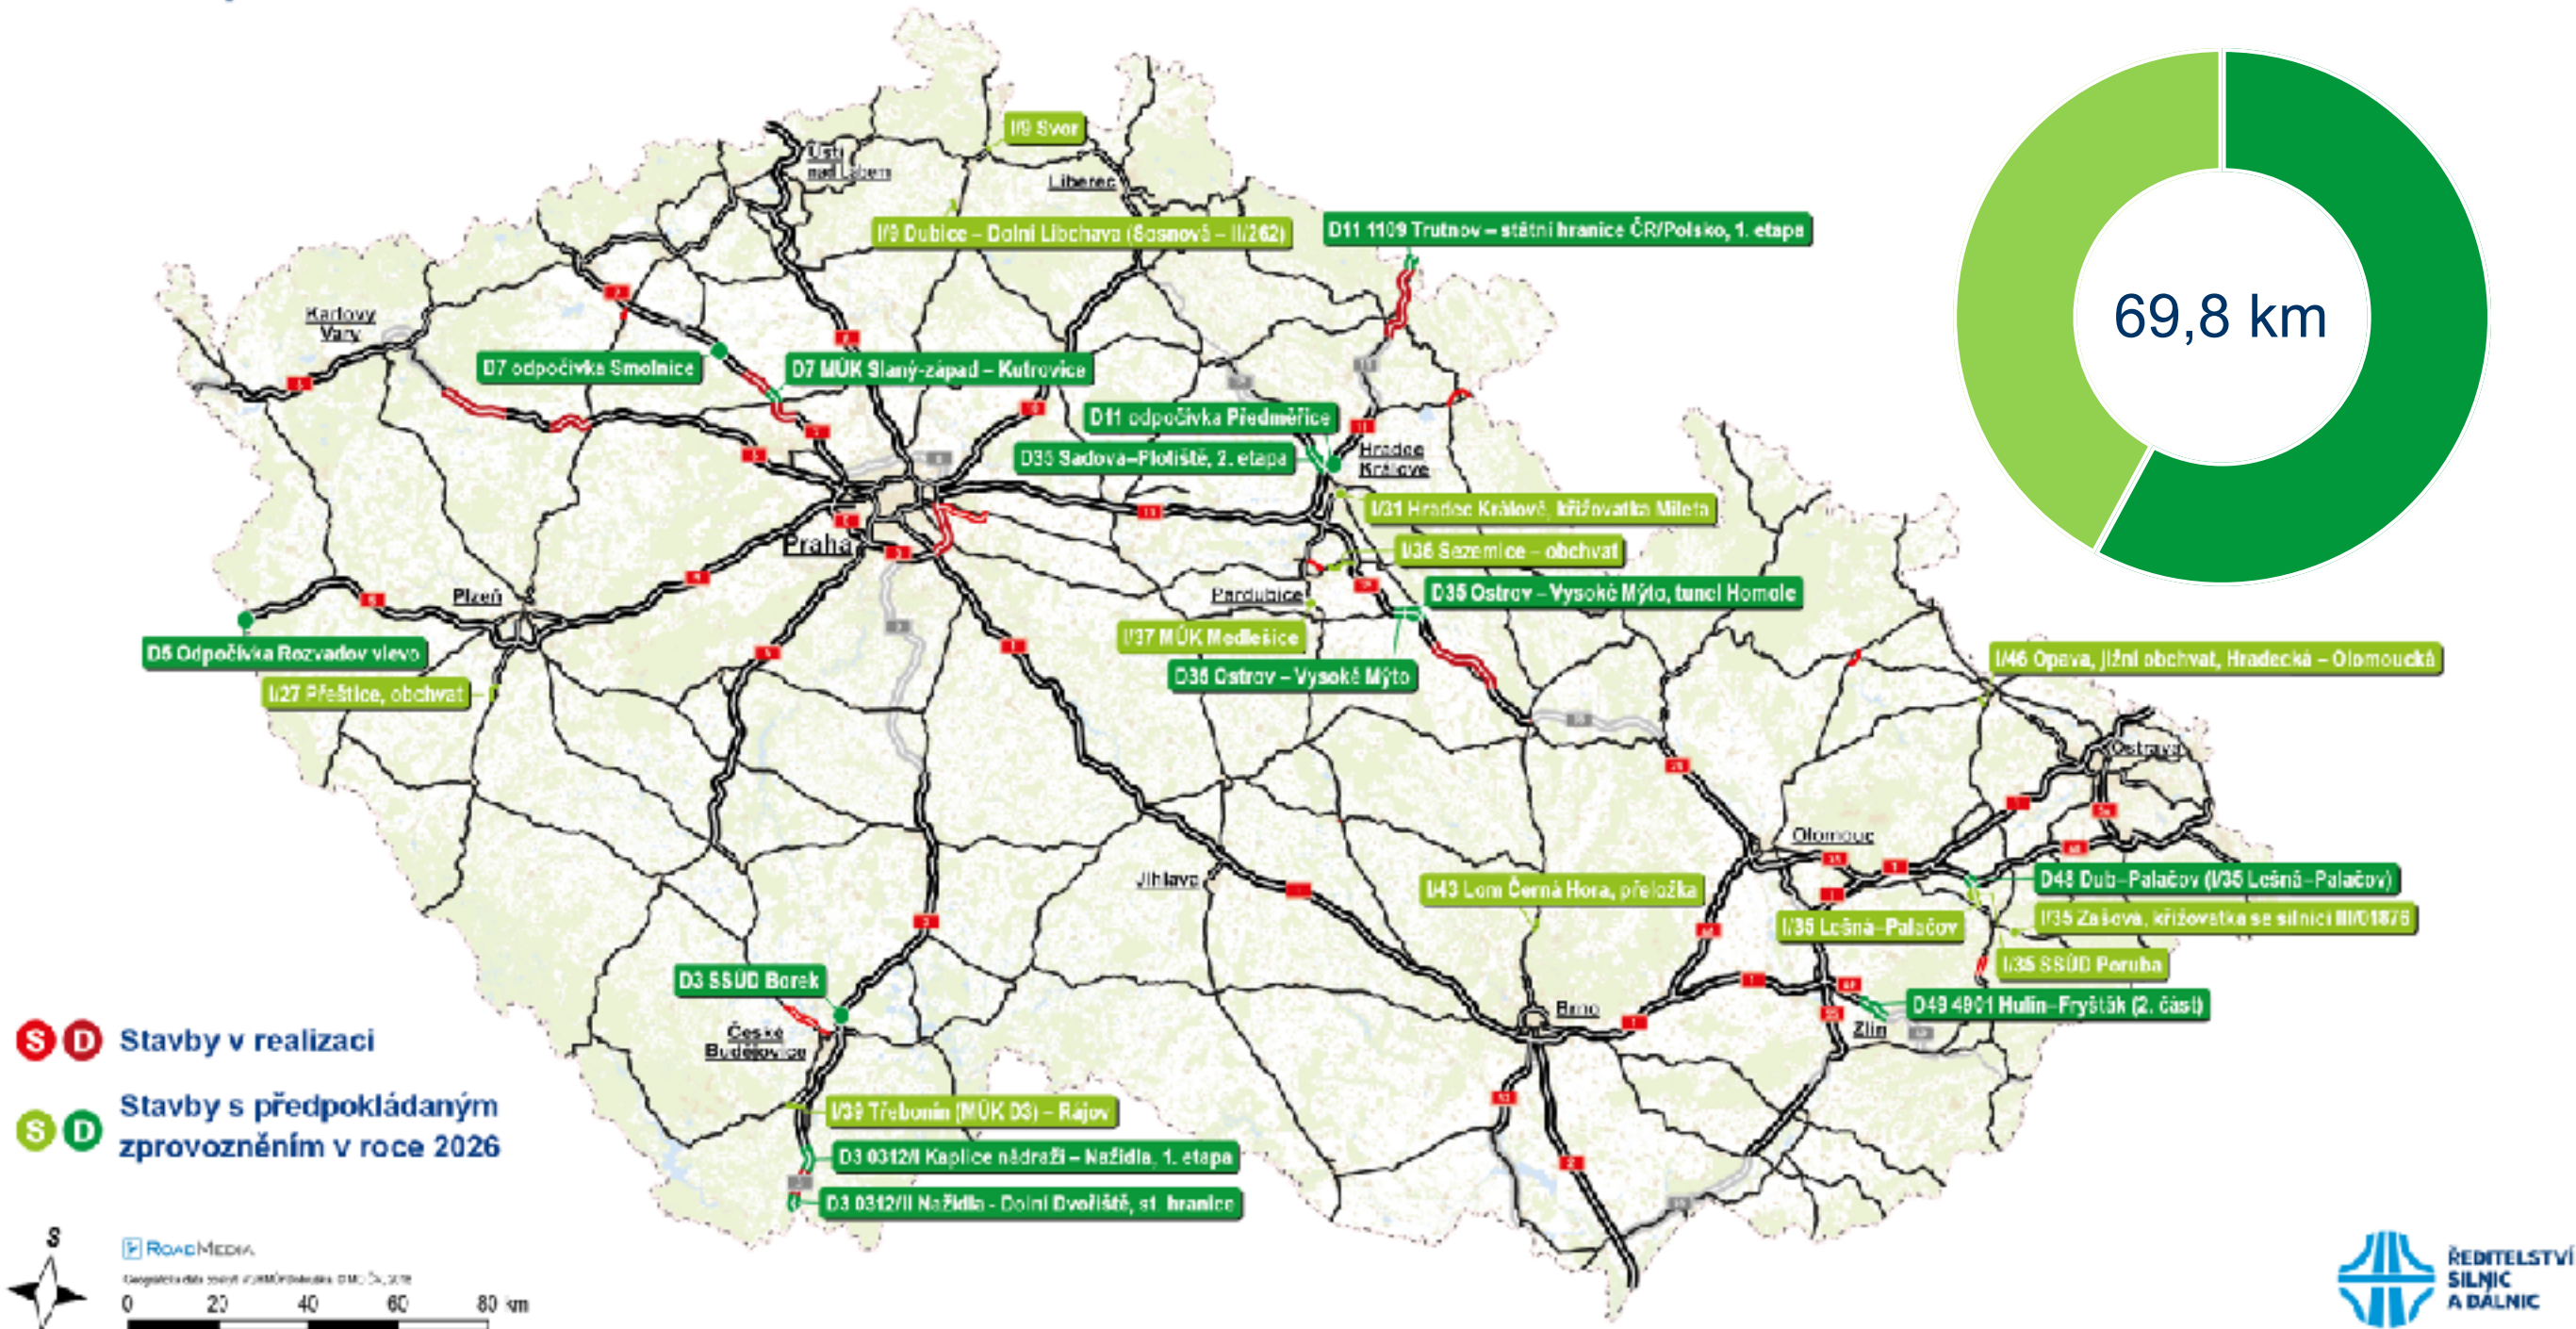




Dálniční tahy

Vývoj přípravy a realizace staveb na hlavních dálničních tazích

D3 stavba 0310/I Úsilné – Hodějovice (MÚK Pohůrka)

Dálnice D0 Pražský okruh

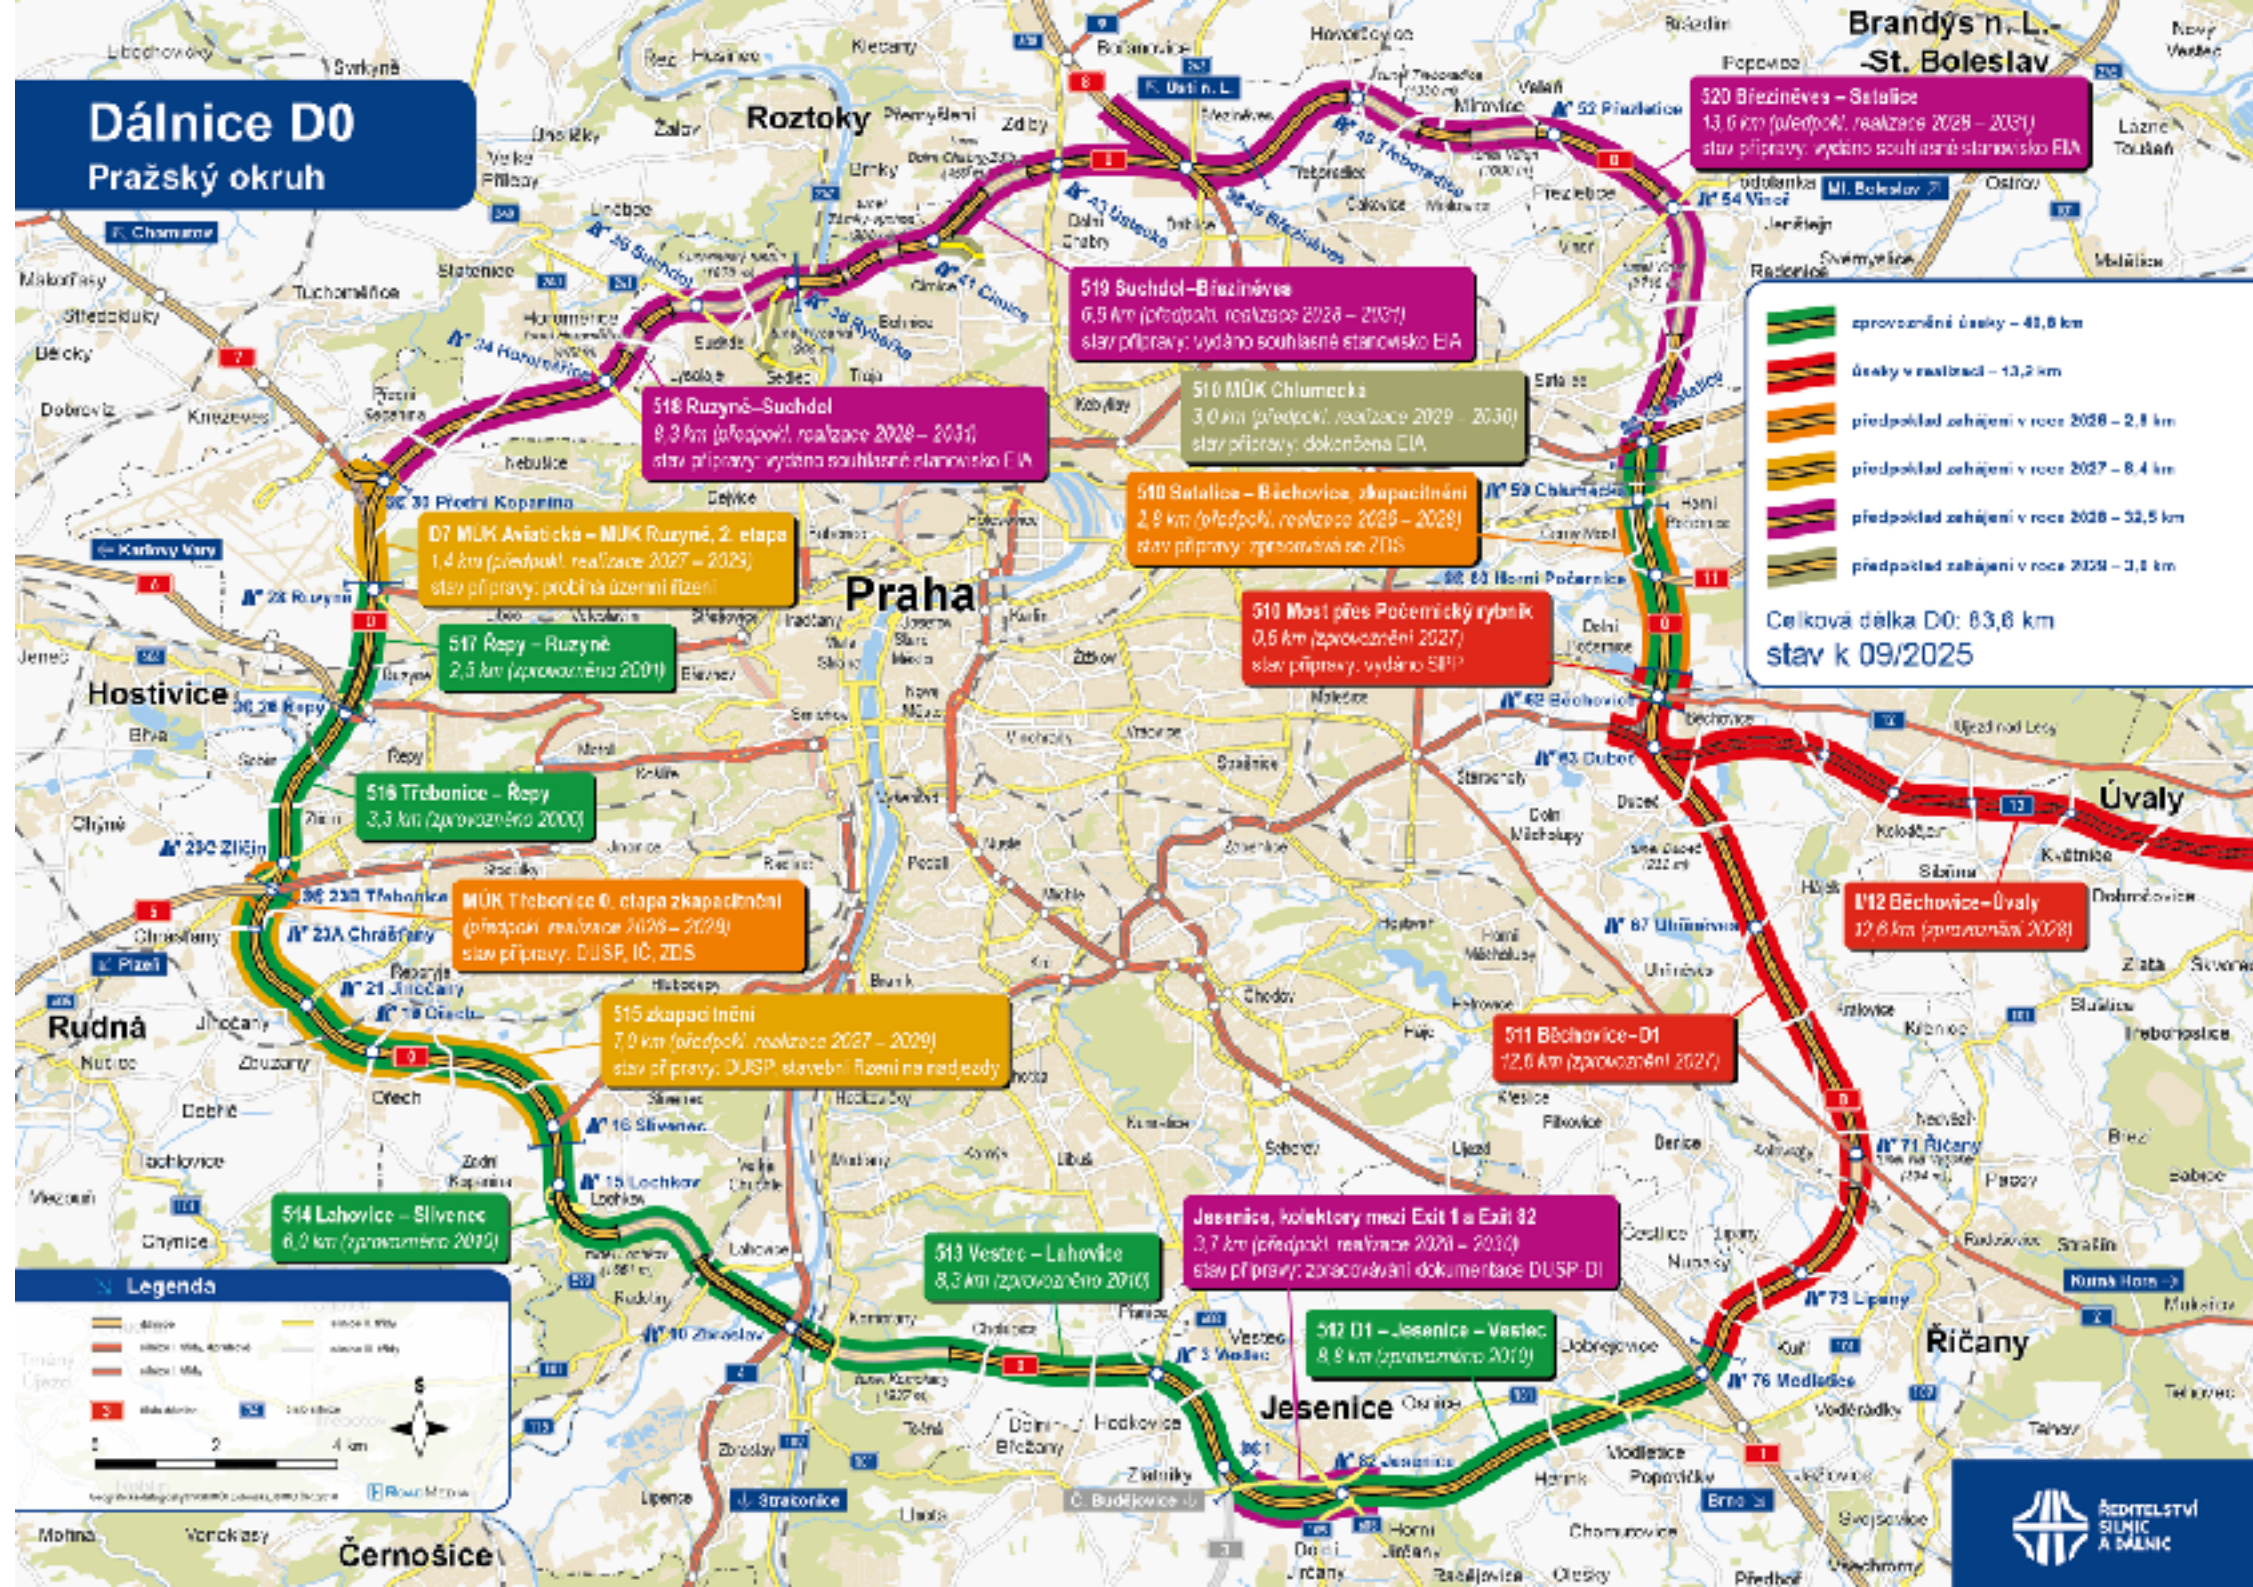


Dálnice D3

Praha – Tábor – Č. Budějovice – Rakousko

-  zprovozněné úseky – 94,2 km
-  úseky v realizaci – 15,5 km
-  předpoklad zahájení v roce 2028 – 58,5 km

Celková délka: 168,2 km
stav k 09/2025

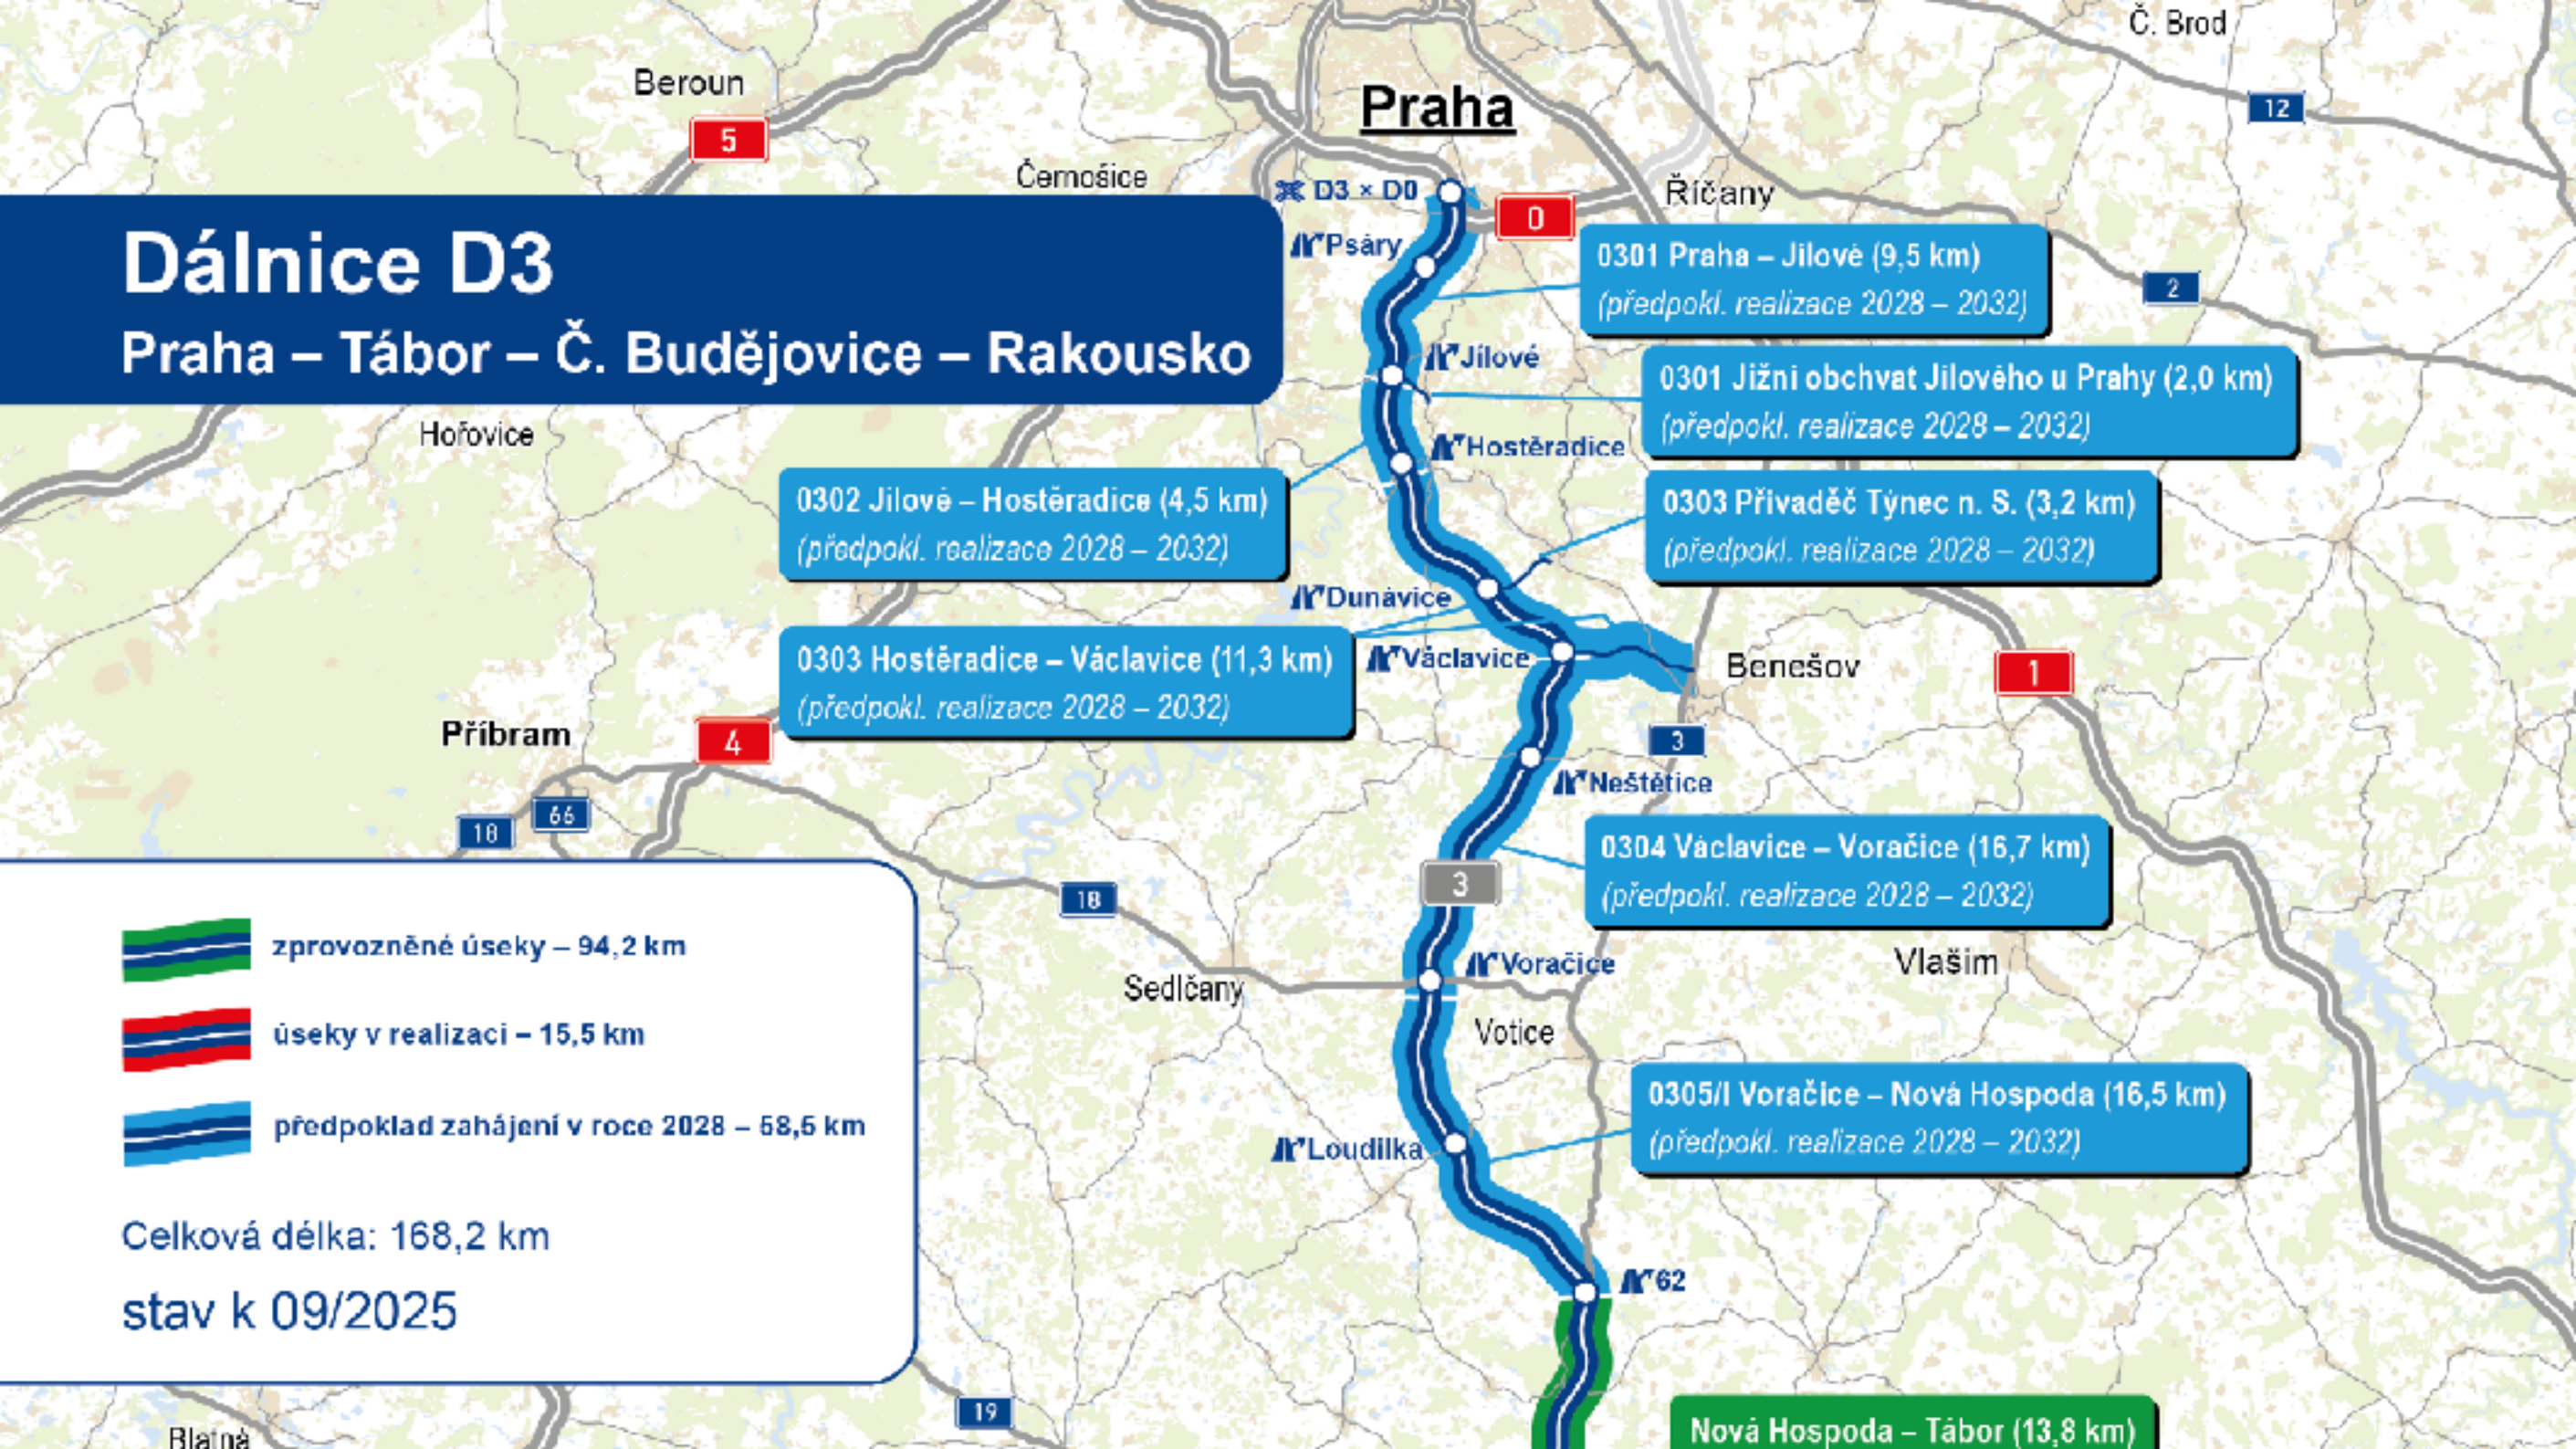


Dálnice D35

Jičín – Hradec Králové – Olomouc – Lipník n. B.



- zprovozněné úseky – 92,9 km
- úseky v realizaci – 64 km
- předpoklad zahájení v roce 2025 – 16,3 km
- předpoklad zahájení v roce 2026 – 35,4 km
- předpoklad zahájení v roce 2028

Celková délka: 209,6 km
stav k 09/2025

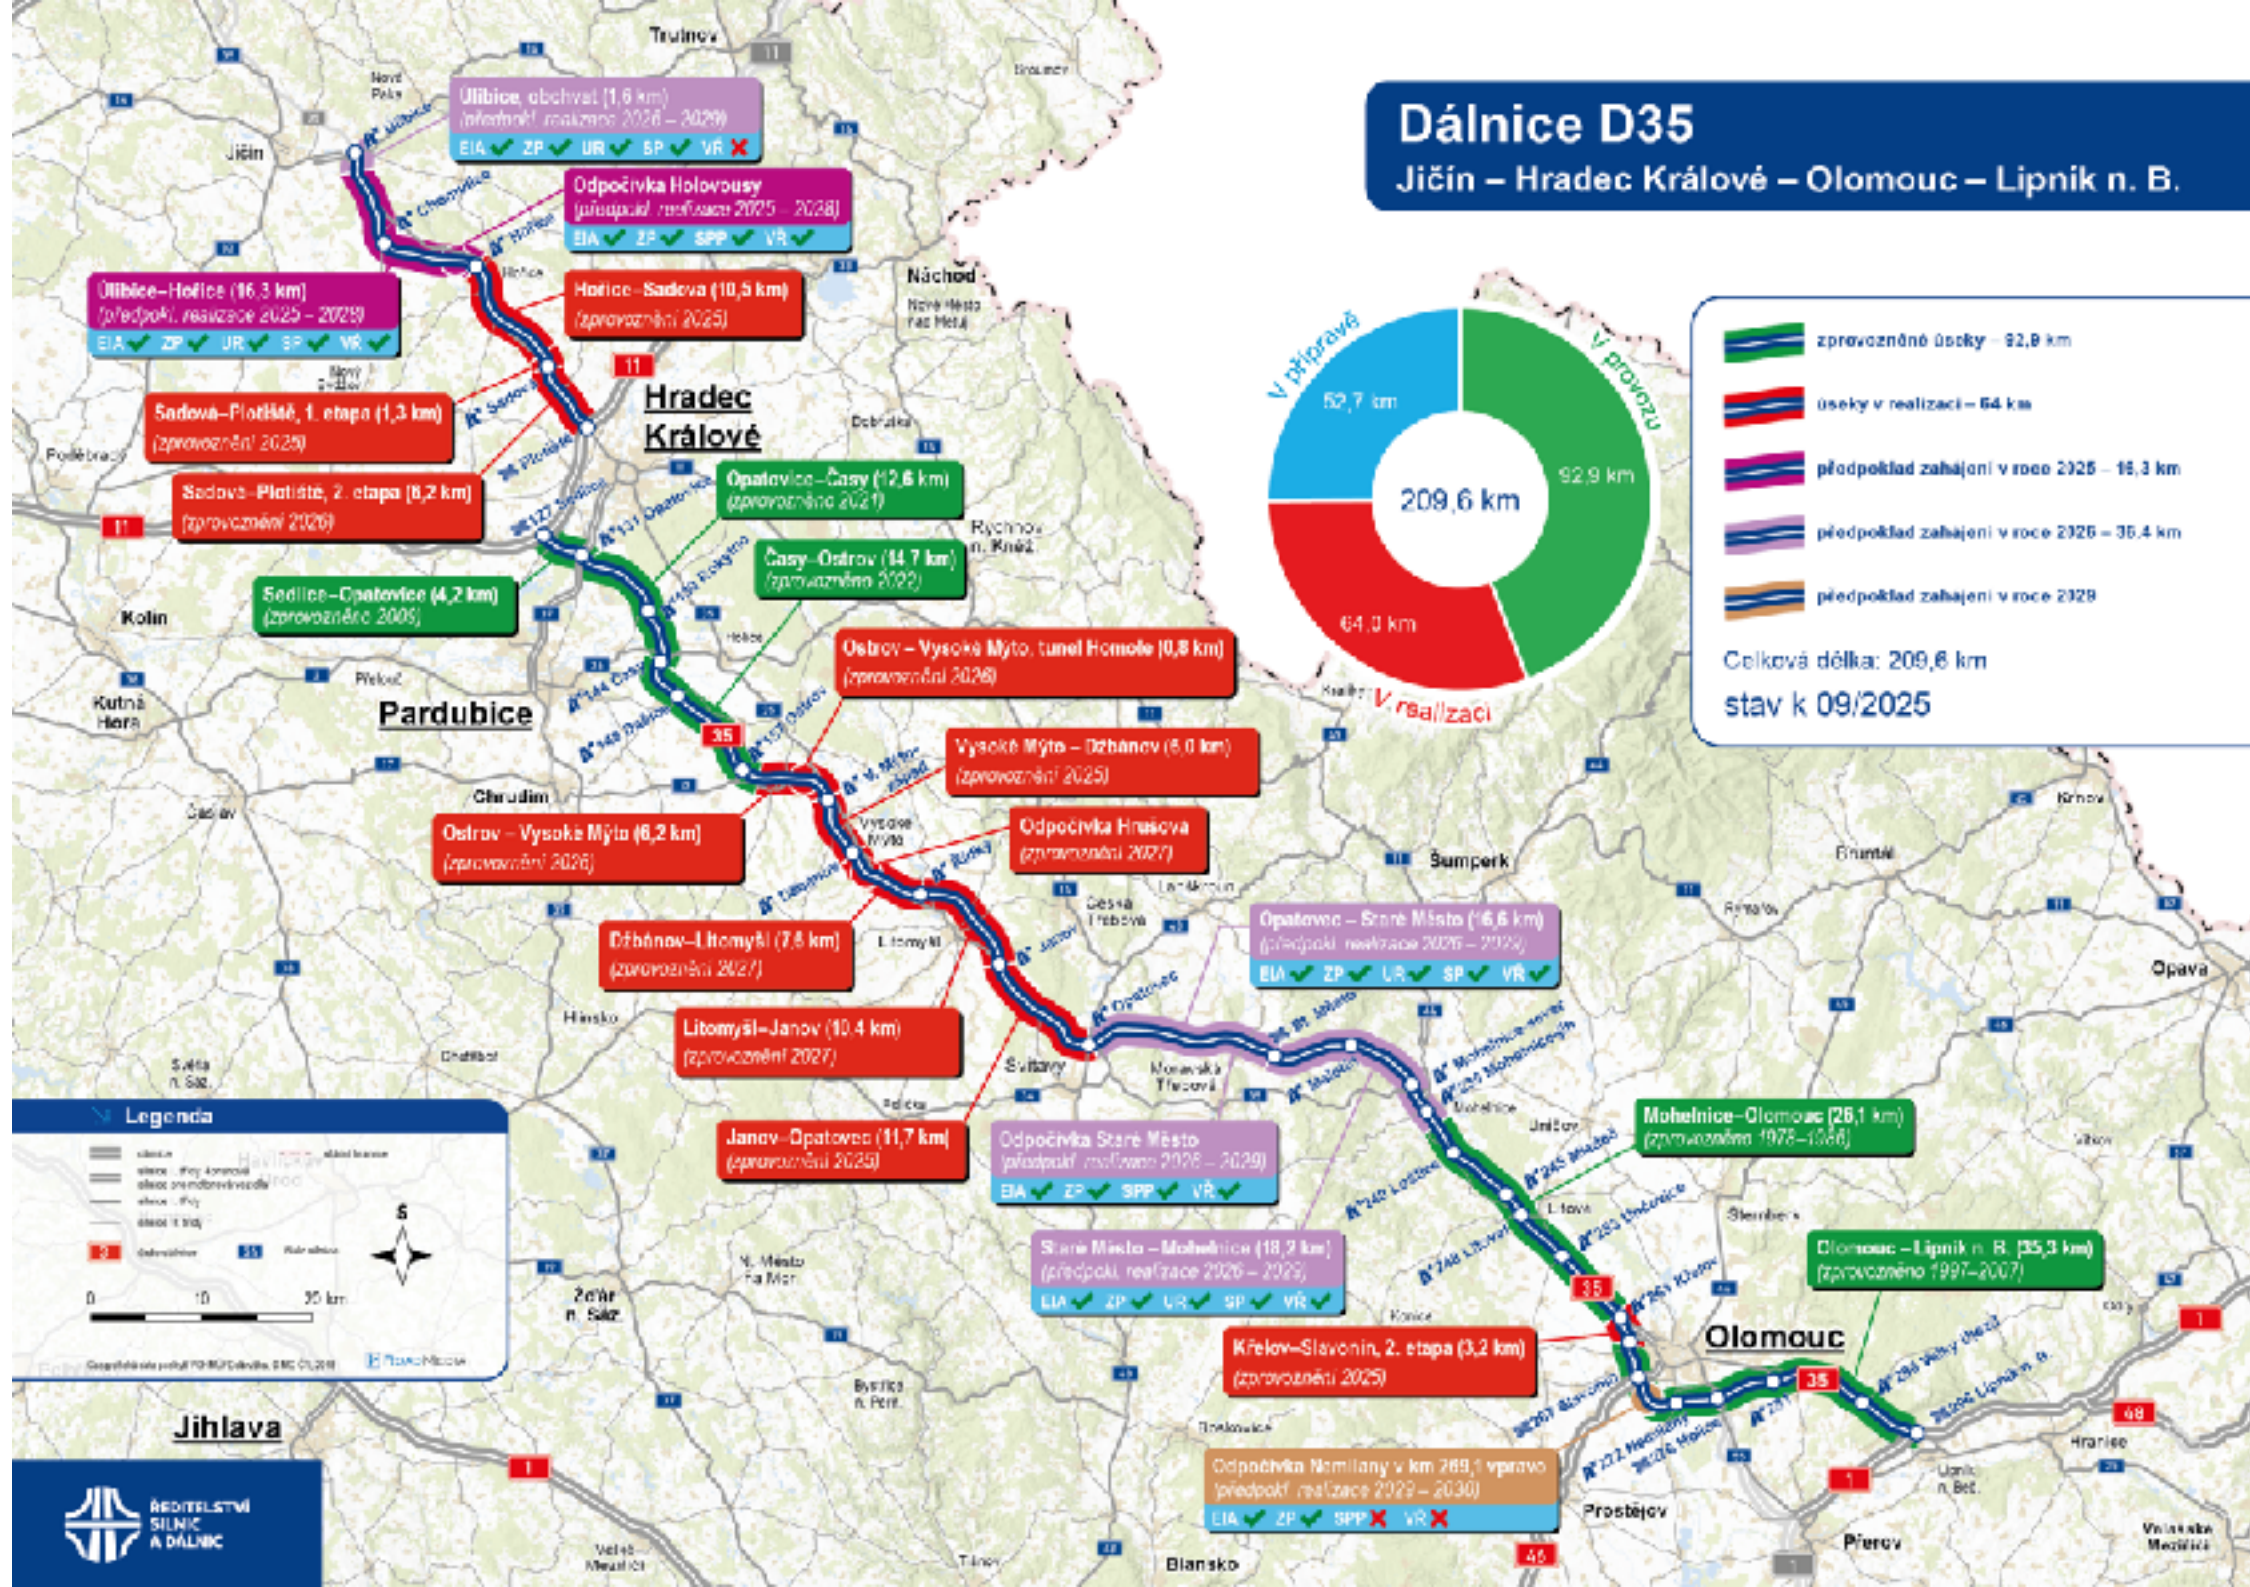

Dálnice D6


Název stavby	Zahájení	Provoz
Hořesedly, přeložka	02/2023	09/2025
Hořovičky, obchvat	03/2023	09/2025
Petrohrad – Lubenec	07/2024	2025/2027
Knínice–Bošov	03/2025	2027
Žalmanov–Knínice	07/2025	2027
Olšová Vrata – Žalmanov	2026	2028
Karlovy Vary – Olšová Vrata	2026	2028



- Zprovozněno 51%
- V realizaci 23%
- V přípravě 26%

Dálnice D7

Název stavby	Zahájení	Provoz
MÚK Aviatická – MÚK Ruzyně, 2.et.	2027	2029
MÚK Aviatická – MÚK Ruzyně, 1.et.	2025	2028
MÚK Knovíz - MÚK Slaný-západ	12/2024	2027
MÚK Slaný-západ - Kutrovice	10/2024	2026
Kutrovice - Panenský Týnec	12/2024	2027
Postoloprty, zkapacitnění obchvatu	2026	2029

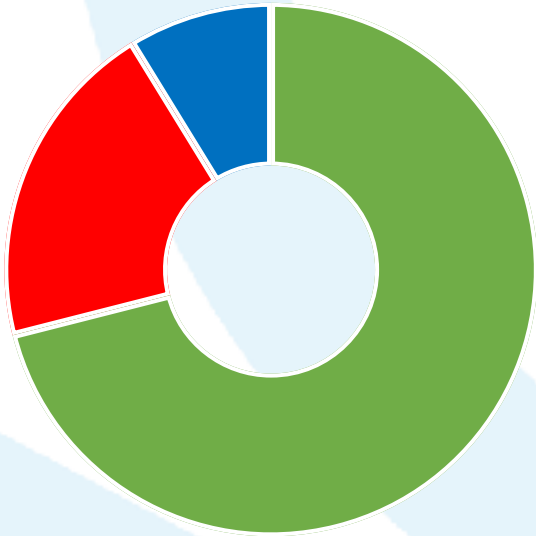


- Zprovozněno 71%
- V realizaci 20%
- V přípravě 9%

Dálnice D11

Název stavby	Zahájení	Provoz
1106 Jaroměř – Trutnov	2025	2028
1107 Trutnov – st. hr. Česko/Polsko	2024	2028 (3km 2026)

Dálnice D55

Název stavby	Zahájení	Provoz
5501 Olomouc – Kokory	2023	2025
5502 Kokory – Přerov	2026	2029
5506 Napajedla – Babice, most SO 201	2023	2025
5506 Napajedla – Babice	2026	2029
5510 Bzenec – Bzenec-Přívóz	2028	2031
5511 Bzenec-Přívóz – Rohatec	2028	2031
5512 Rohatec – Lužice	2028	2032
5513 Lužice – Břeclav	2028	2032

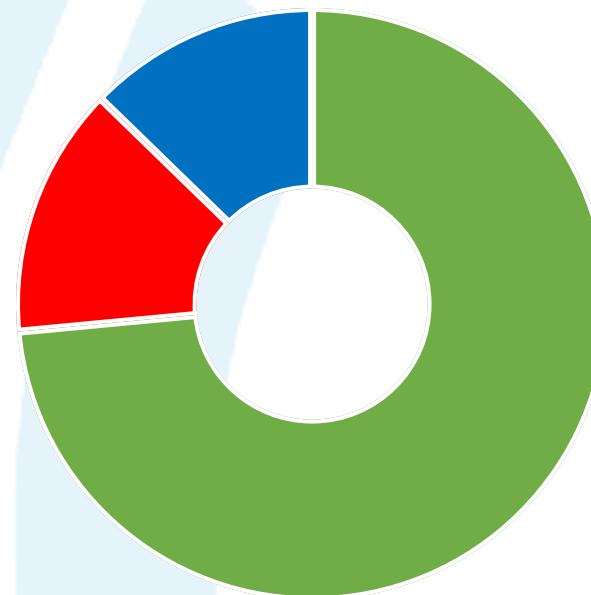


- Zprovozněno 74 %
- V realizaci 14 %
- V přípravě 13 %



- Zprovozněno 41%
- V realizaci 8%
- V přípravě 51%

Dálnice D48


Název stavby	Zahájení	Provoz
MÚK Bělotín – Rybí II. etapa	2026	2029
Dub – Palačov	2023	2026
MÚK Nošovice	2027	2028

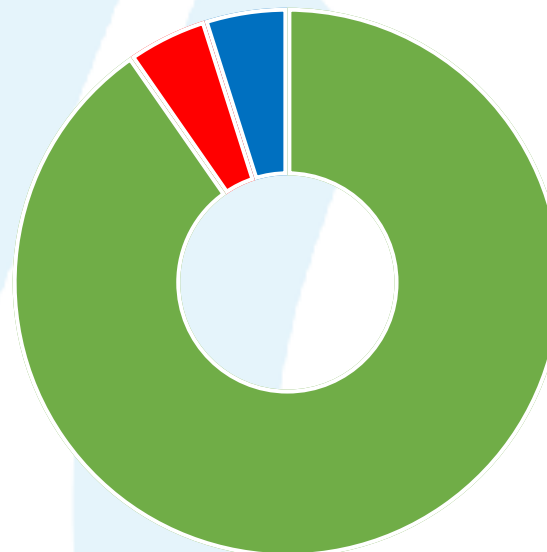

- Zprovozněno 90%
- V realizaci 5%
- V přípravě 5%

Dálnice D49 a sil. I/49

Název stavby	Zahájení	Provoz
4901 Hulín – Fryšták (2. část)	12/2021	2026
4902.1 Fryšták – Lípa, 1. etapa	2029	2032
4902.2 Fryšták – Lípa, 2. etapa	2030	2033
4902.3 Fryšták – Lípa, 3. etapa	2031	2034
4903.1 Lípa – Vizovice	2033	2036
4903.2 Vizovice – Pozděchov	2033	2036
4904 Pozděchov – Horní Lideč	2033	2036
4905 Horní Lideč – Střelná	2033	2036

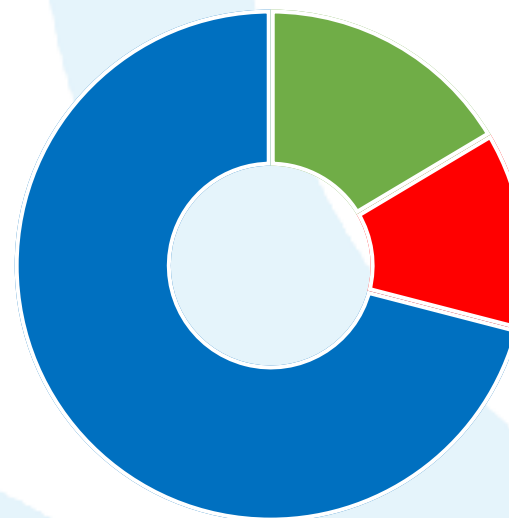

- Zprovozněno 16%
- V realizaci 13%
- V přípravě 71%



Významné opravy dálnic a silnic

Dokončené opravy

D S Opravy v přípravě




Plán významných oprav dálnic v roce 2026

Název akce	Požadavek (tis. Kč bez DPH)
D11 Oprava AB v úseku km 40,400 – 26,890 vlevo	537 190,08 Kč
D5 Oprava vozovky v km 88,37 – 94,0 oboustranně	495 867,77 Kč
D5 Oprava AB km 61,15 – 67,33 vpravo / km 61,00 – 58,51 vlevo, MÚK 50, MÚK 62, MÚK 67, oprava mostů D5-065..1/..2 + D5-066..1/..2	578 512,40 Kč
D5 Oprava vozovky CB v km 110,3 – 100,7 vlevo	371 900,83 Kč
D5 Oprava mostů D5-005..1-2	123 966,94 Kč
D0 km 9,326 – 11,788 P + L, oprava AB	53 719,01 Kč
D5 km 18,6 – 34,5 P oprava AB a mosty ev. č. D5-025..1, D5-026..1, D5-028..3, D5-030..3, D5-031..1, D5-034..3, D5-035..1, D5-038..3	578 512,40 Kč
D5 km 144.199 – 139.626 L, výměna CBK	190 082,64 Kč
D2 Oprava mostů D2-053..1 a D2-054..1	58 000,00 Kč
D2 Oprava mostů D2-015, D2-016, D2-017	129 000,00 Kč
D1 Oprava SDP km 296–321	147 532,71 Kč
D2 Oprava mostu D2-012	53 719,01 Kč
D1 Oprava mostů D1-417, D1-422, D1-424 a D1-425	49 586,78 Kč
D2 Oprava mostů D2-030..1, D2-033 a D2-034..1	21 998,96 Kč

Dálniční síť 2015 vs. 2025

→ stav k 31. 12. 2025

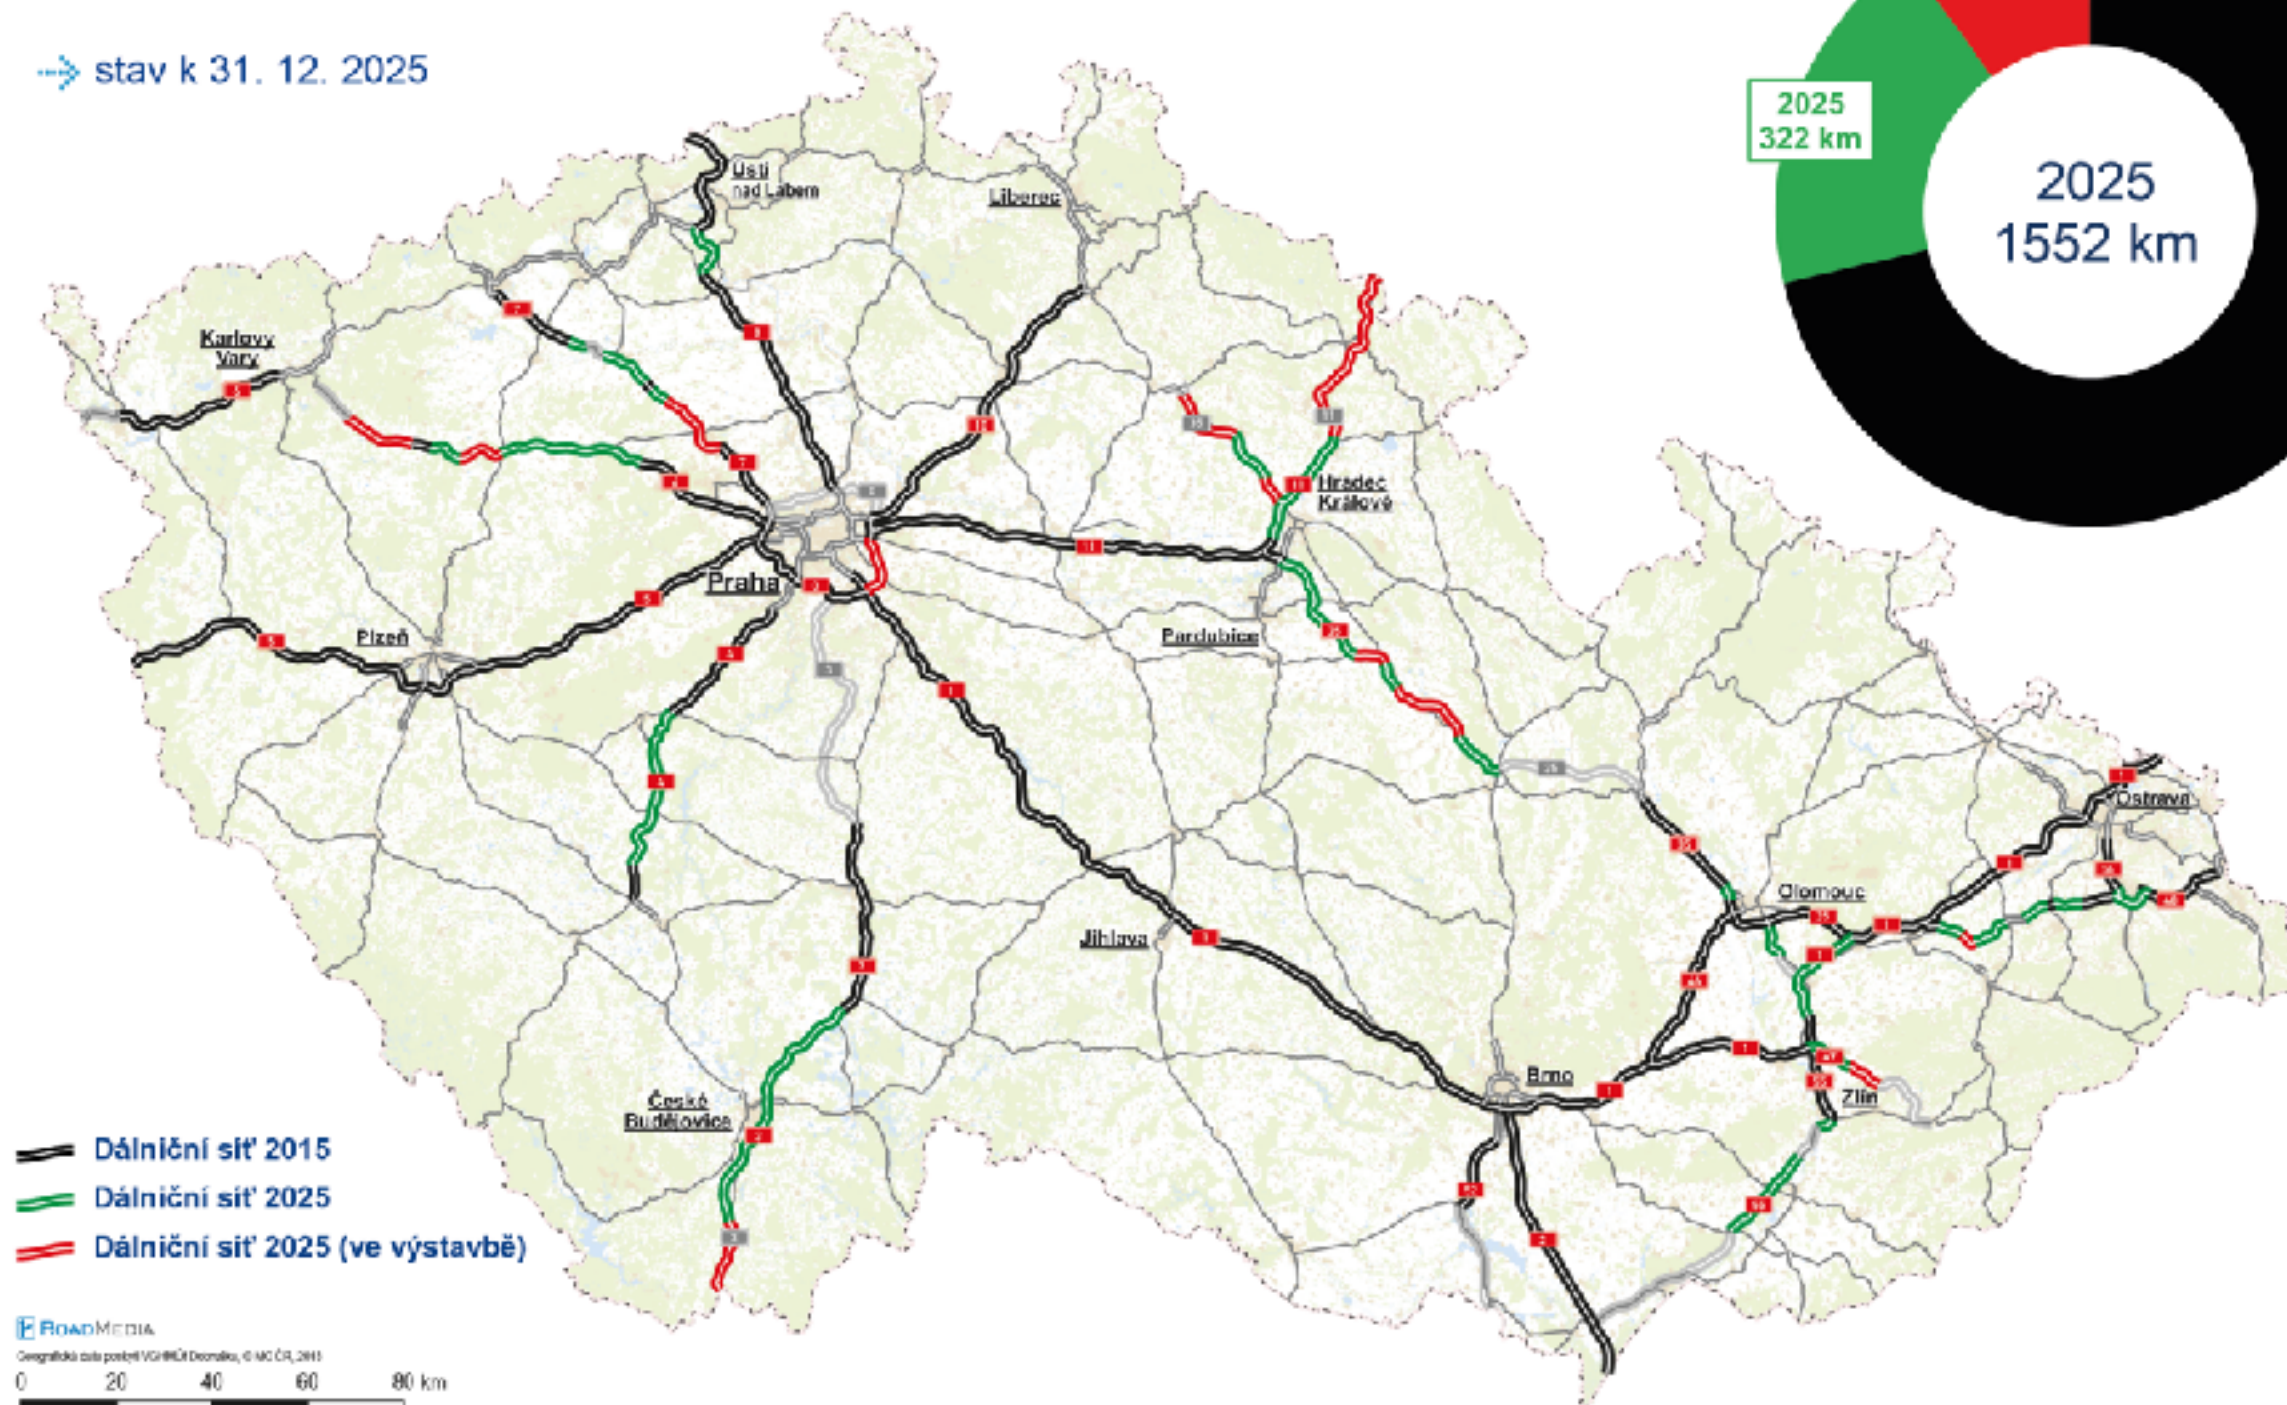


ROADMEDIA

Geografická data poskytl VGHMÚZ Deonika, © MC ČR, 2015

0 20 40 60 80 km

Dálniční síť 2015 vs. 2025

→ stav k 31. 12. 2025

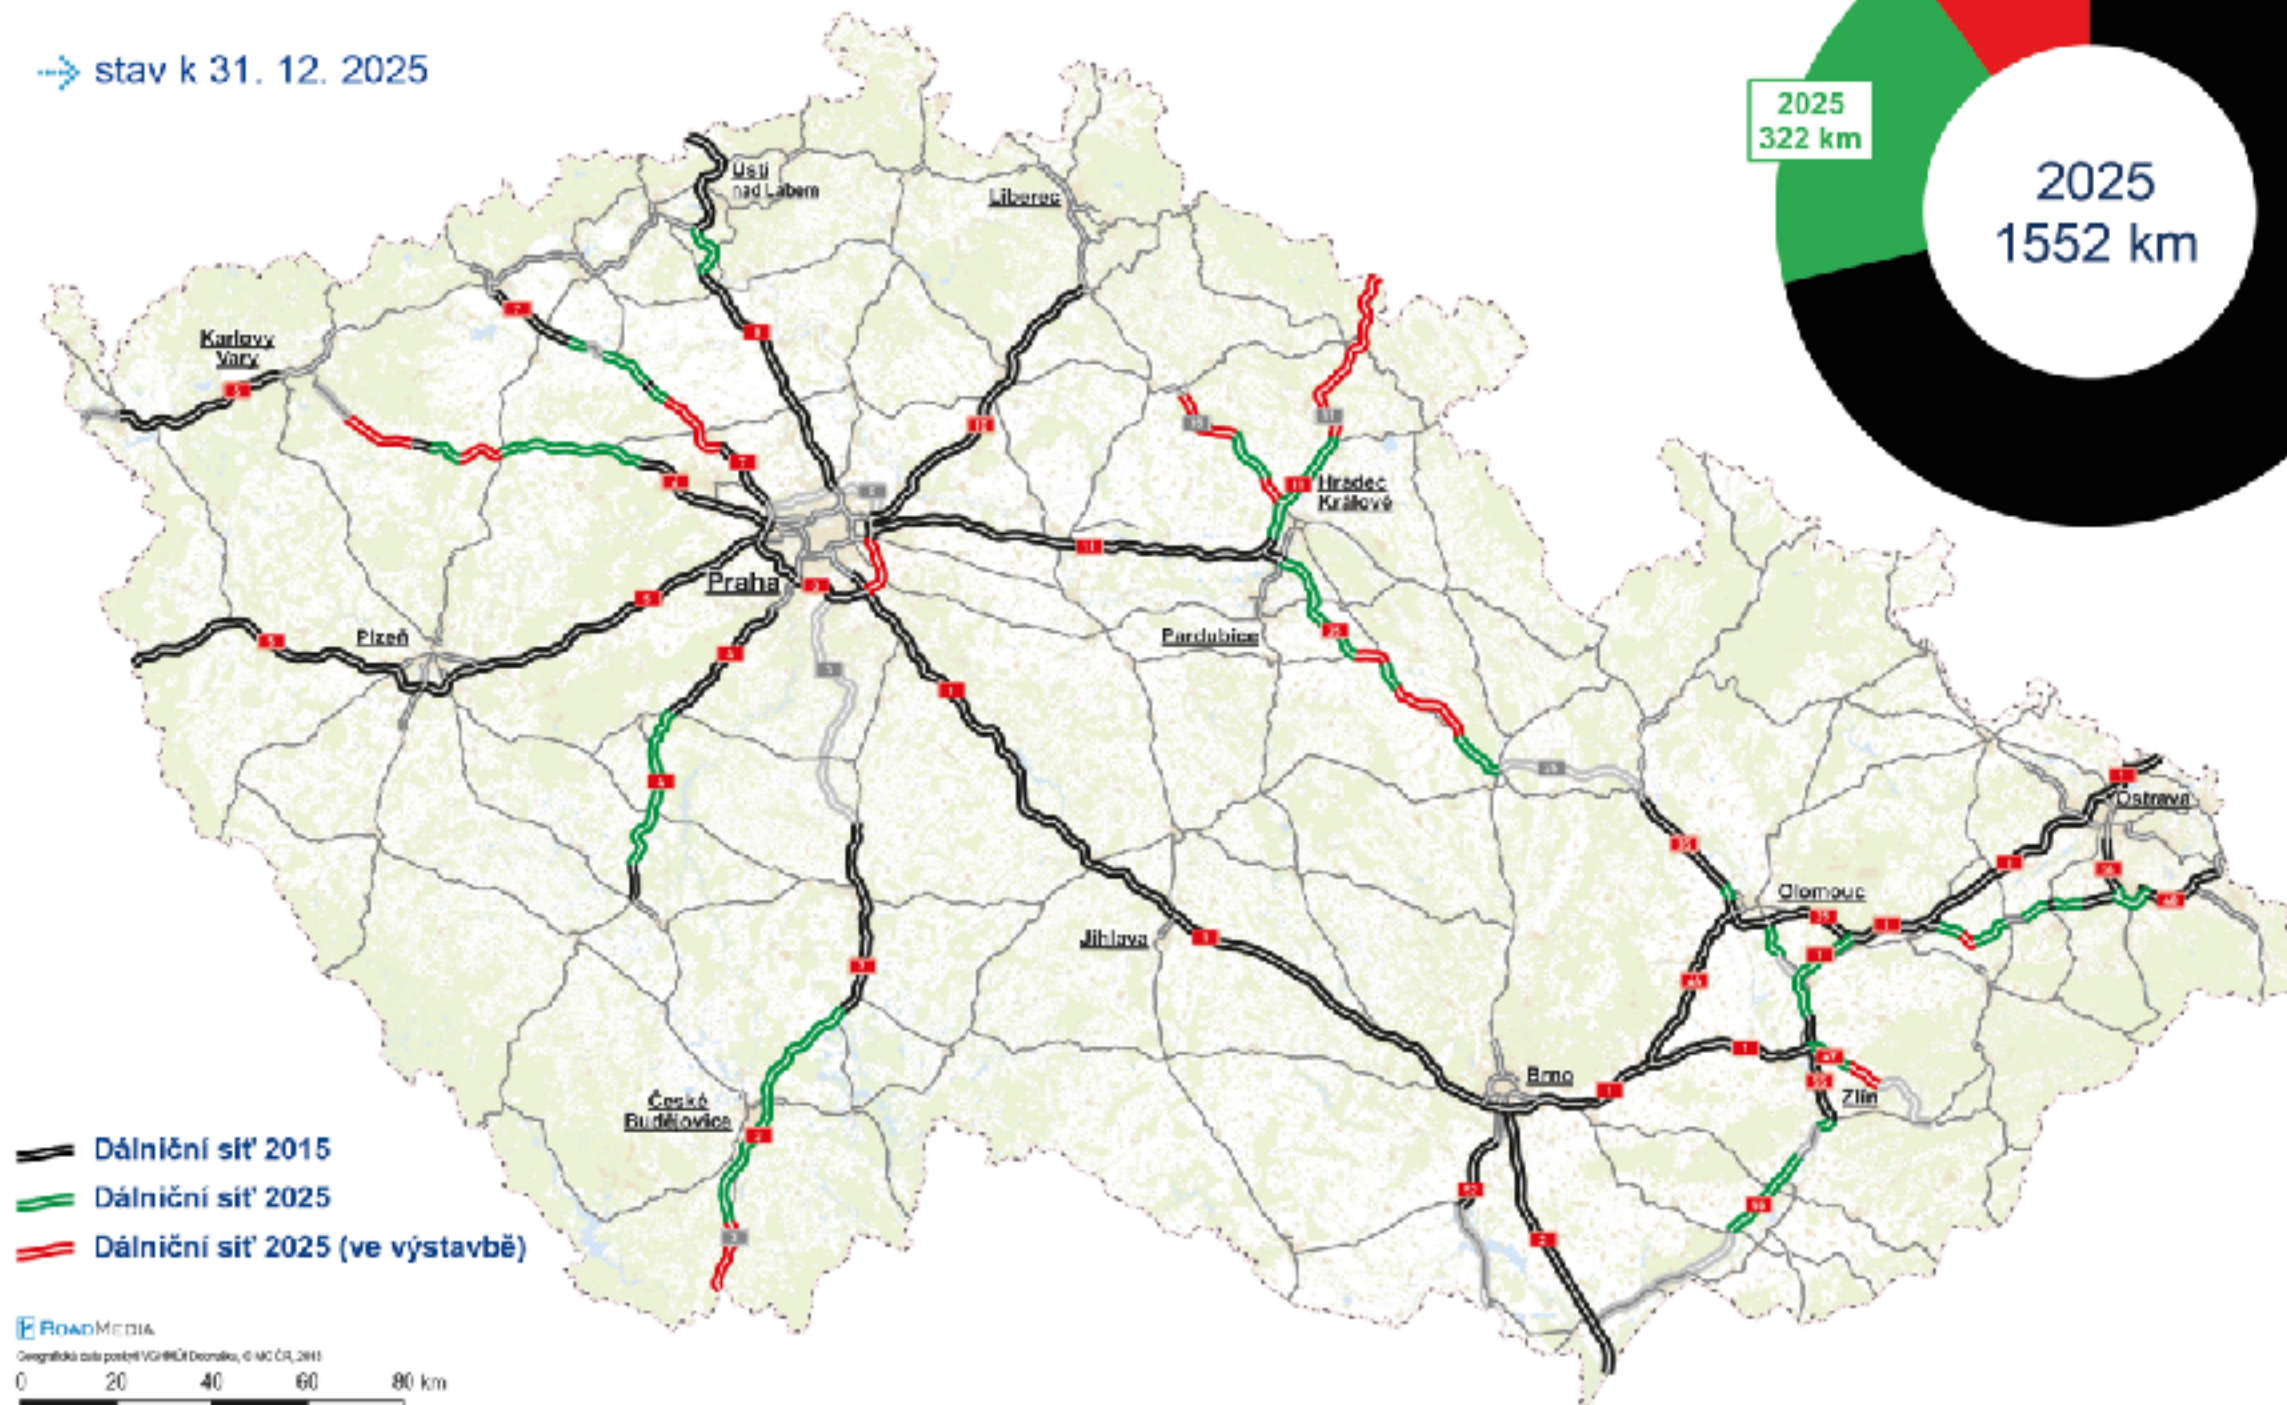


ROADMEDIA

Geografická data poskytl VGHMÚZ Deonika, © MC ČR, 2015

0 20 40 60 80 km

Dálniční síť 2020 vs. 2025

→ stav k 31. 12. 2025

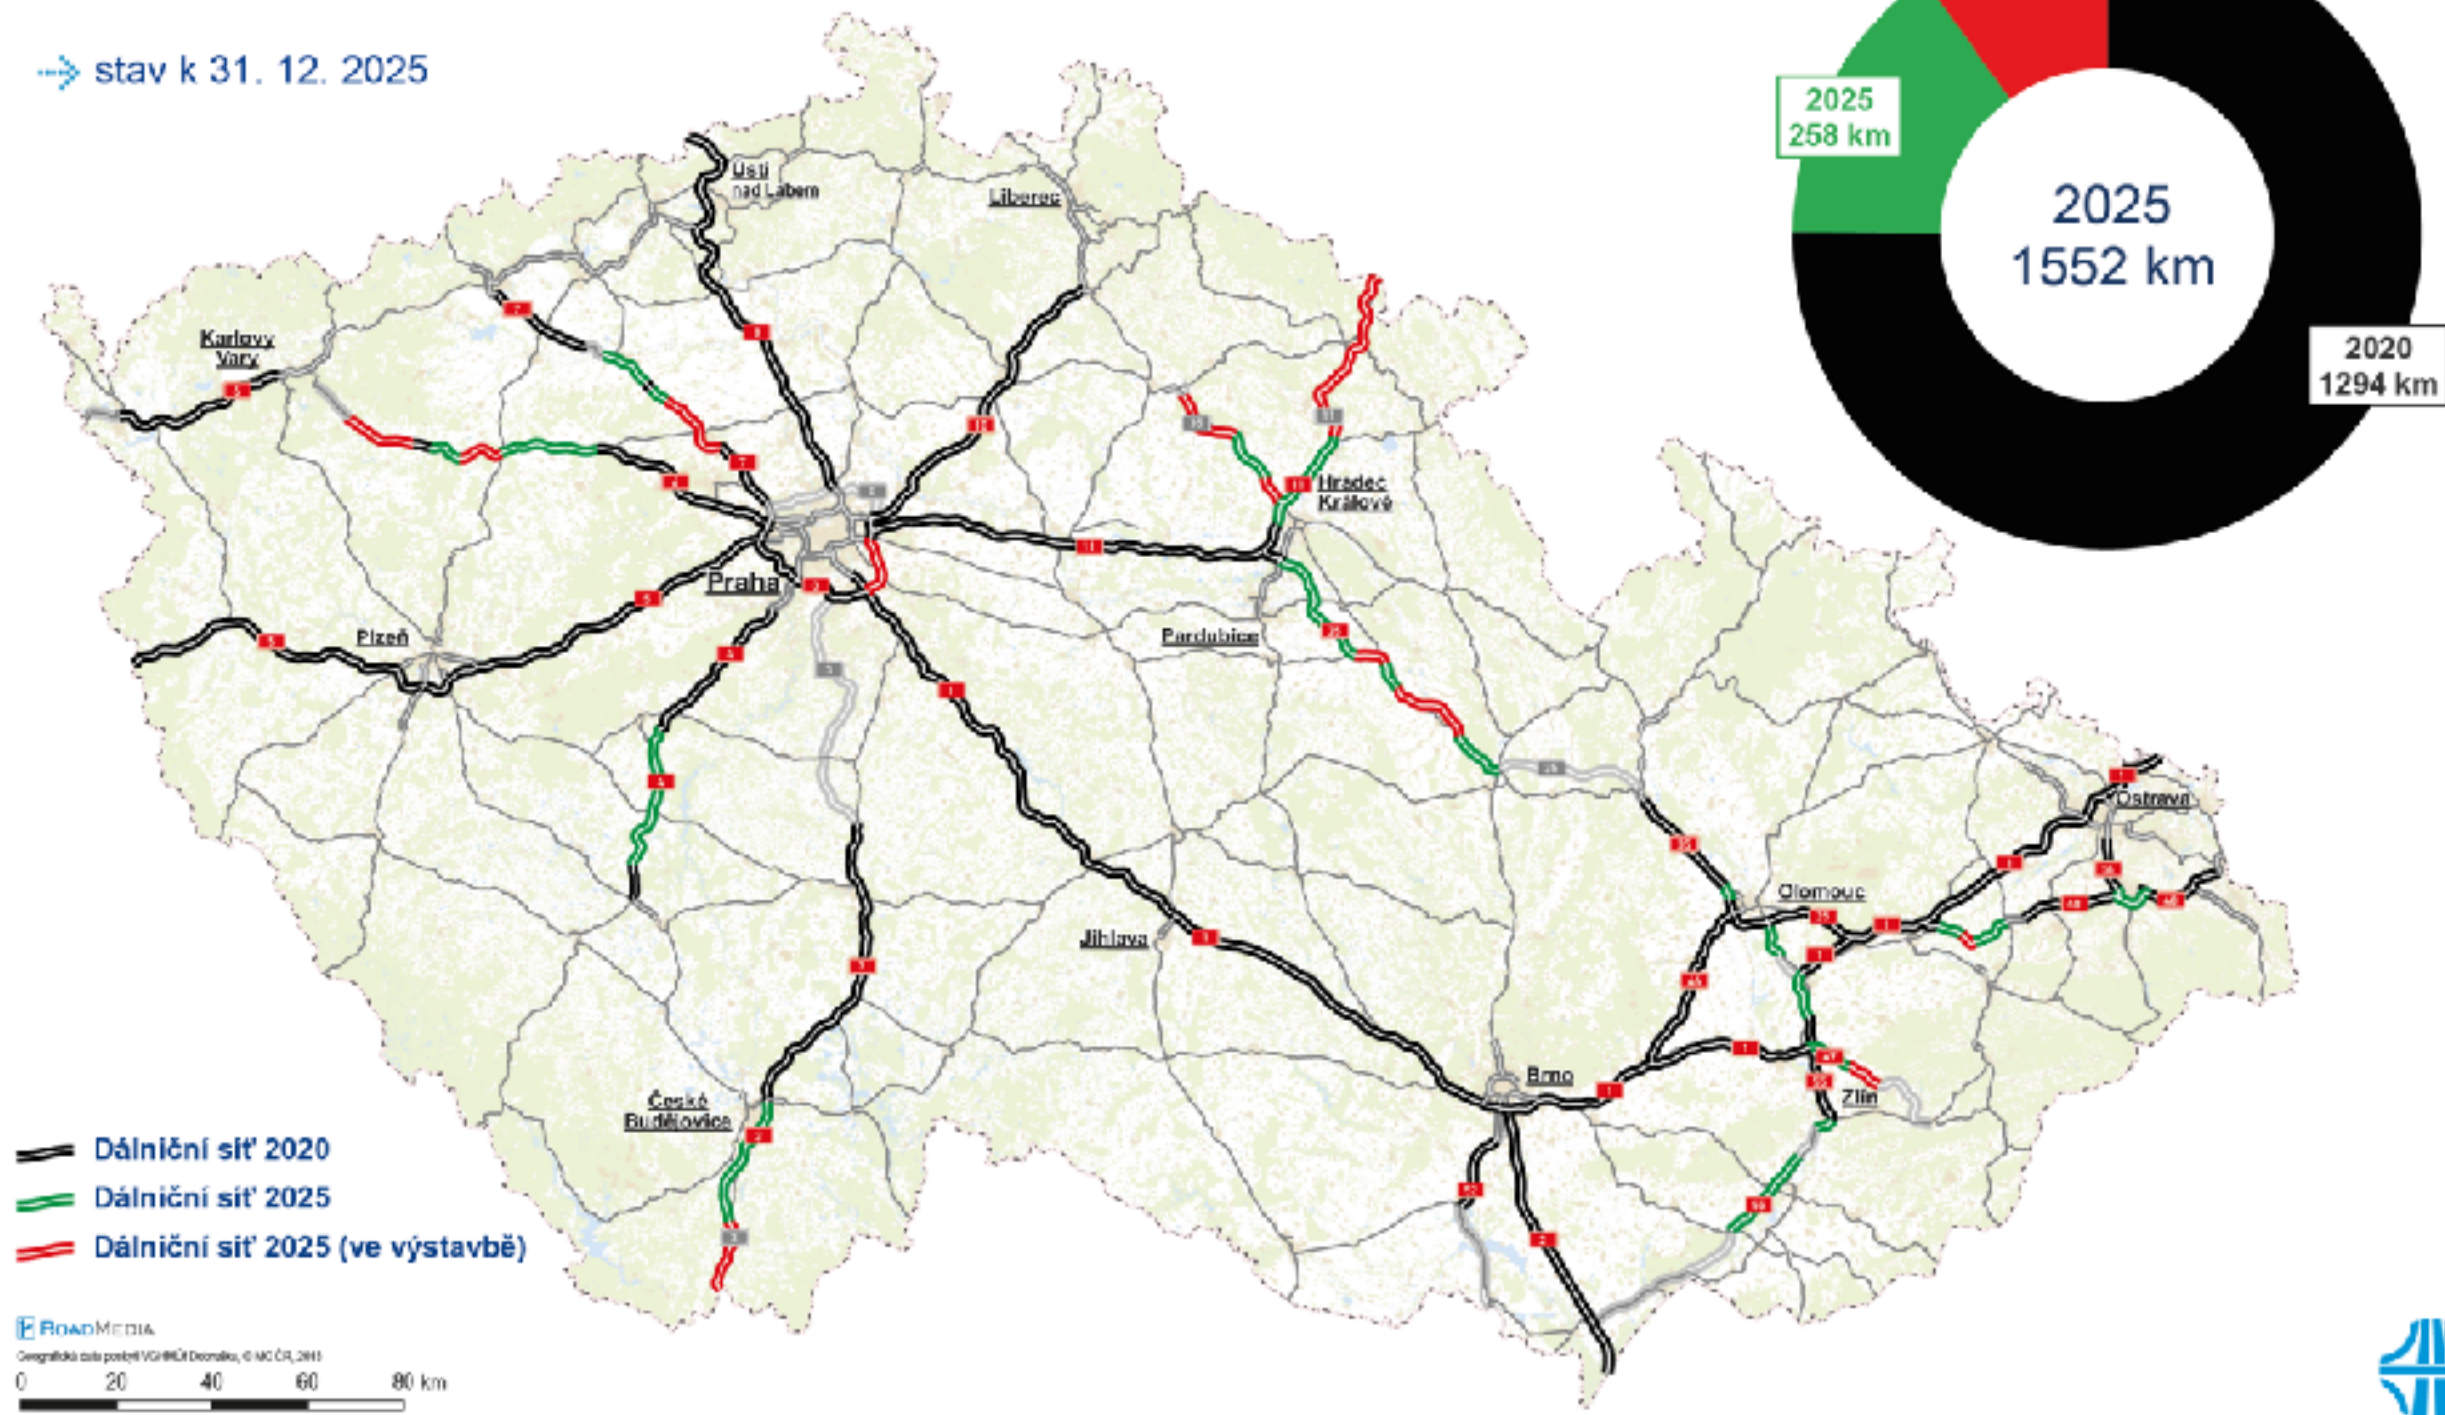



Zimní údržba

Vladimír Výstřela – mechanizátor SSÚD Kocourovec

Zimní údržba

Zimní údržba dálnic I. třídy, části dálnic II. třídy (cca 30 %) a vybraných úseků silnic I. třídy je prováděna vlastními kapacitami - SSÚD.

- 21 SSÚD, plus 3 detašovaná pracoviště (Petrovice, Libníč, Brodek u Prostějova), plus síla pro doplnění posypového materiálu na trase (např. na D1 silo u MÚK Humpolec).

Výkony SSÚD

Výkon ZÚ	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
Posyp (tis. km)	587	371	40	400	274
Sůl (tis. tun)	41	25,3	26,3	28,4	17
Solanka (mil. litrů)	13	8,2	8,8	9,4	6,1

Zimní údržba

Zimní údržba zbývajících dálnic II. třídy a silnic I. třídy je zajištěna dodavatelsky.

- Smlouvy na 8 let 10/2017 – 09/2025 (Oblast Pardubická 10/2018 – 09/2026)
- 14 Oblastí, každá oblast rozdělena na dispečerské obvody


Zajištění údržby vybraných úseků dálnic a silnic I. třídy 1. 10. 2017 – 30. 9. 2025

- Smlouva na 6 leté období od 10/2025 do 9/2031
- 16 Oblastí údržby

Aktuální stav

- 13 Oblastí – uzavřena smlouva
- 1 Oblast Pardubická – probíhá soutěž pro období 10/2026 – 09/2032
- 2 Oblasti (Jihočeská a Olomoucká) – nová rozhodnutí o výběru

Zimní údržba prováděná dodavatelsky po 30. 9. 2025

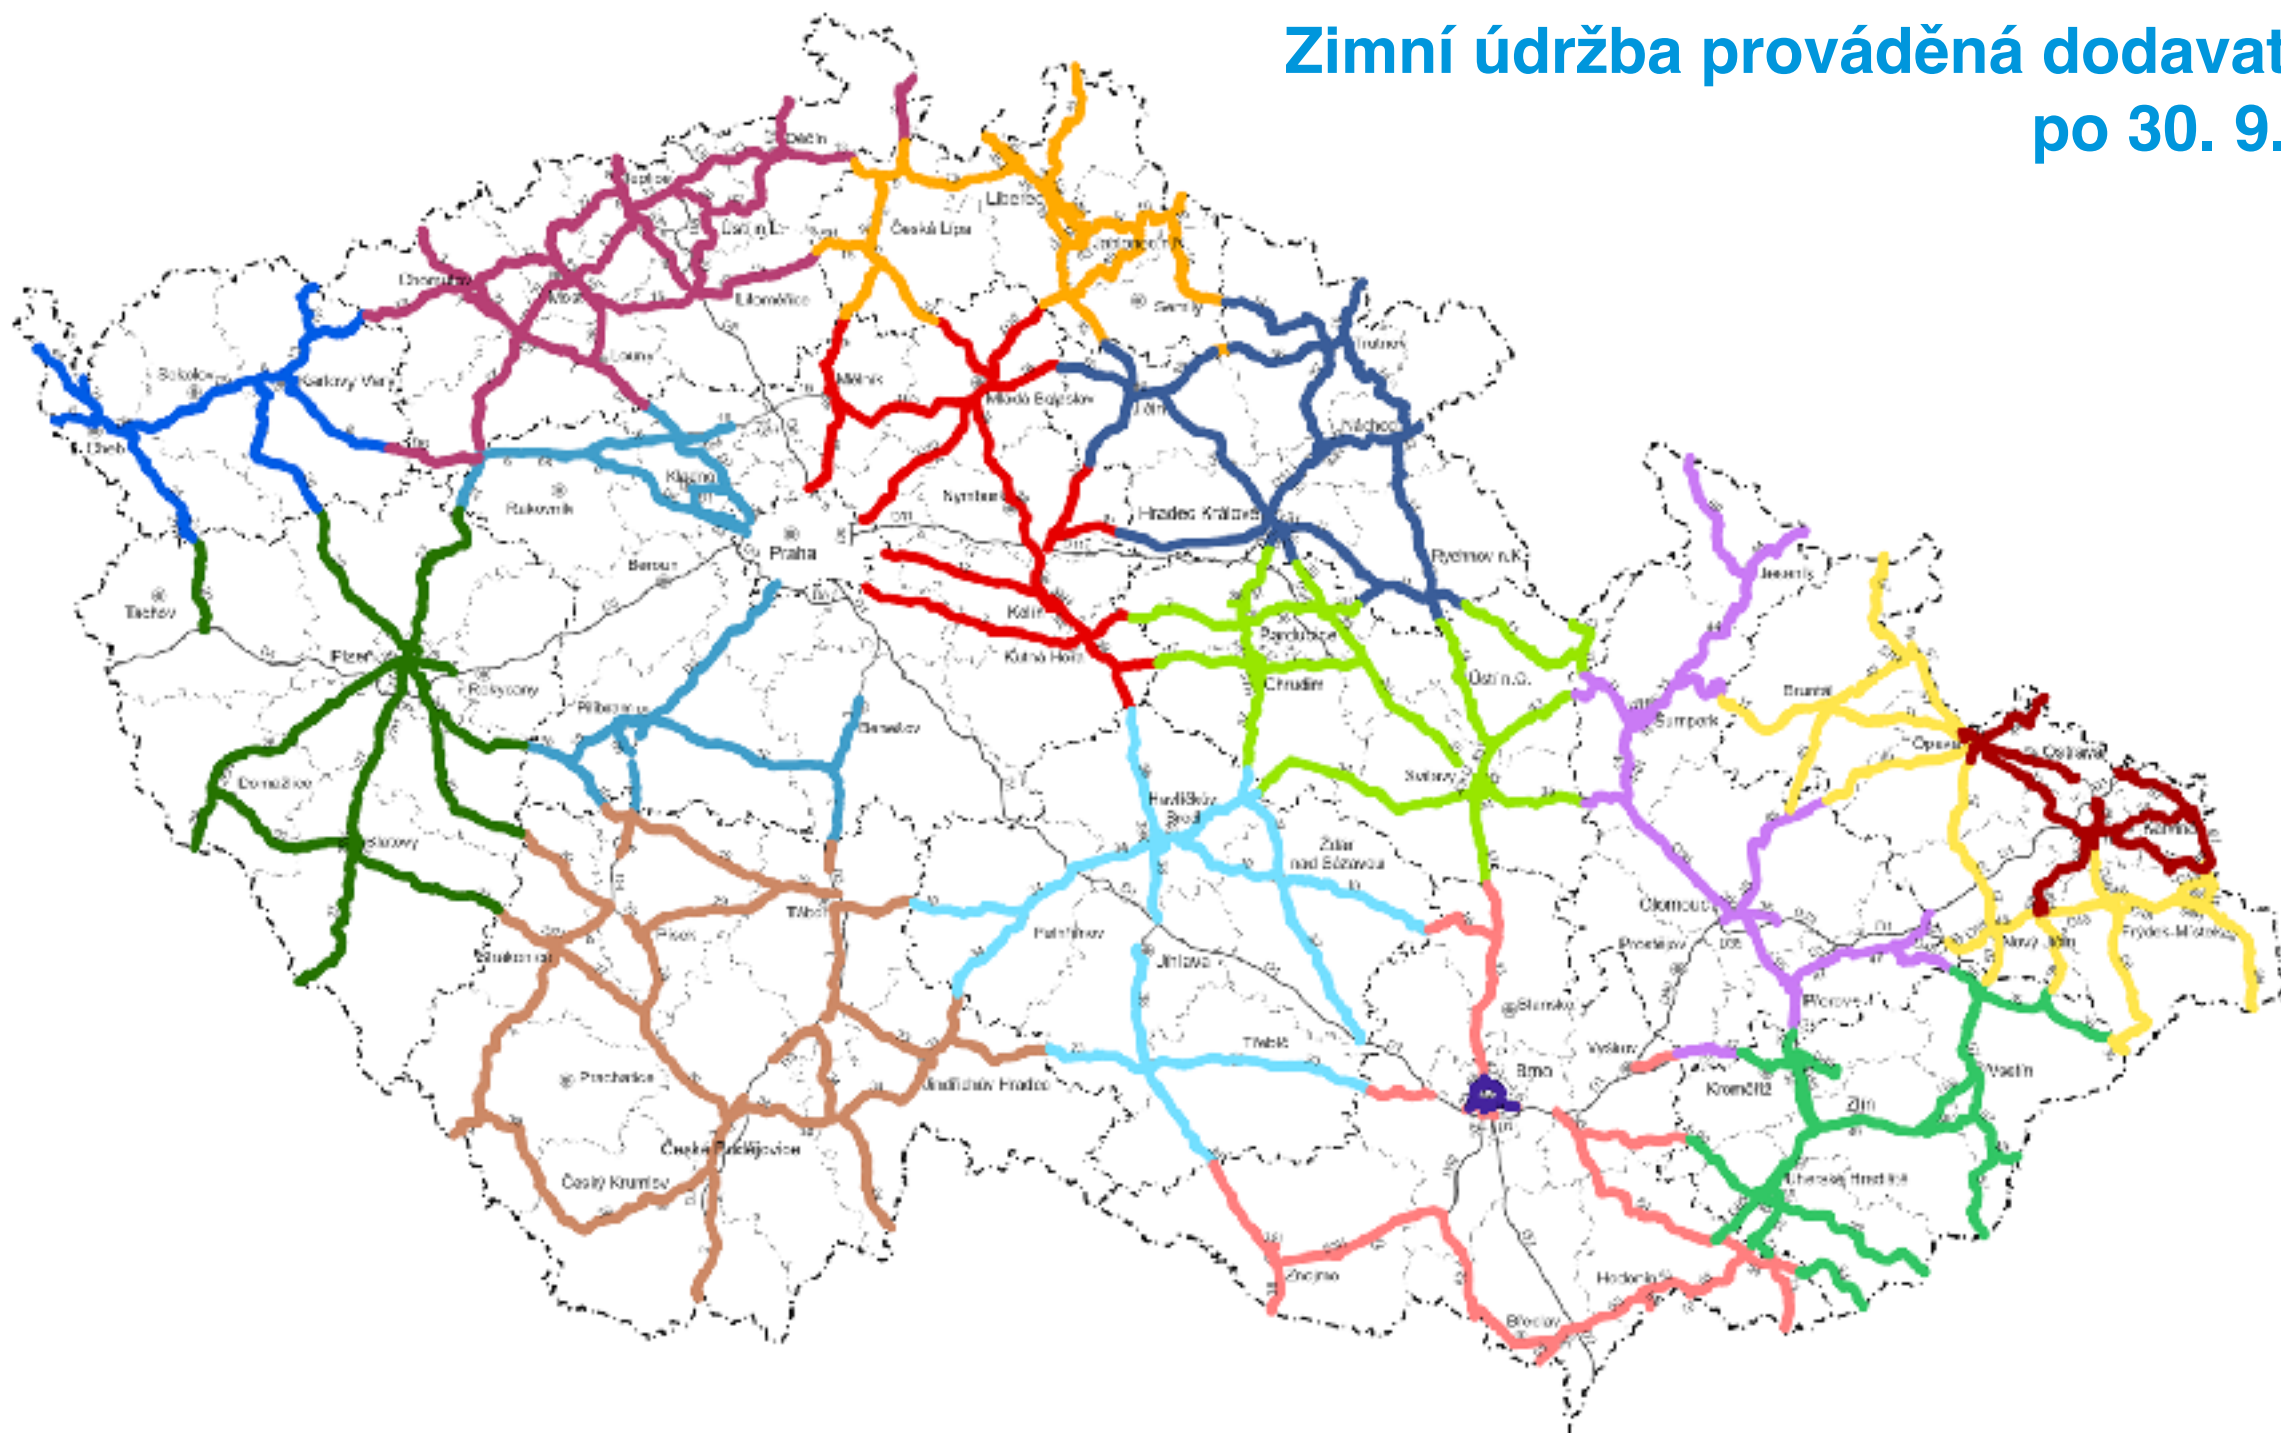




Co nás čeká...

D8 rozšíření odpočívky Klíčany vpravo (09/2024)

Nejdůležitější plány z různých oblastí

- rozvoj CES – schvalování výrobků, TePř apod.
- rozvoj CEV – systém sledování údržby
- SHV – přidávání dalších modulů
- rozvoj BIM
- Digitalizace - CDE
- příprava tendru na nový mýtný systém
- Výstavba odpočívek, elektromobilita

...

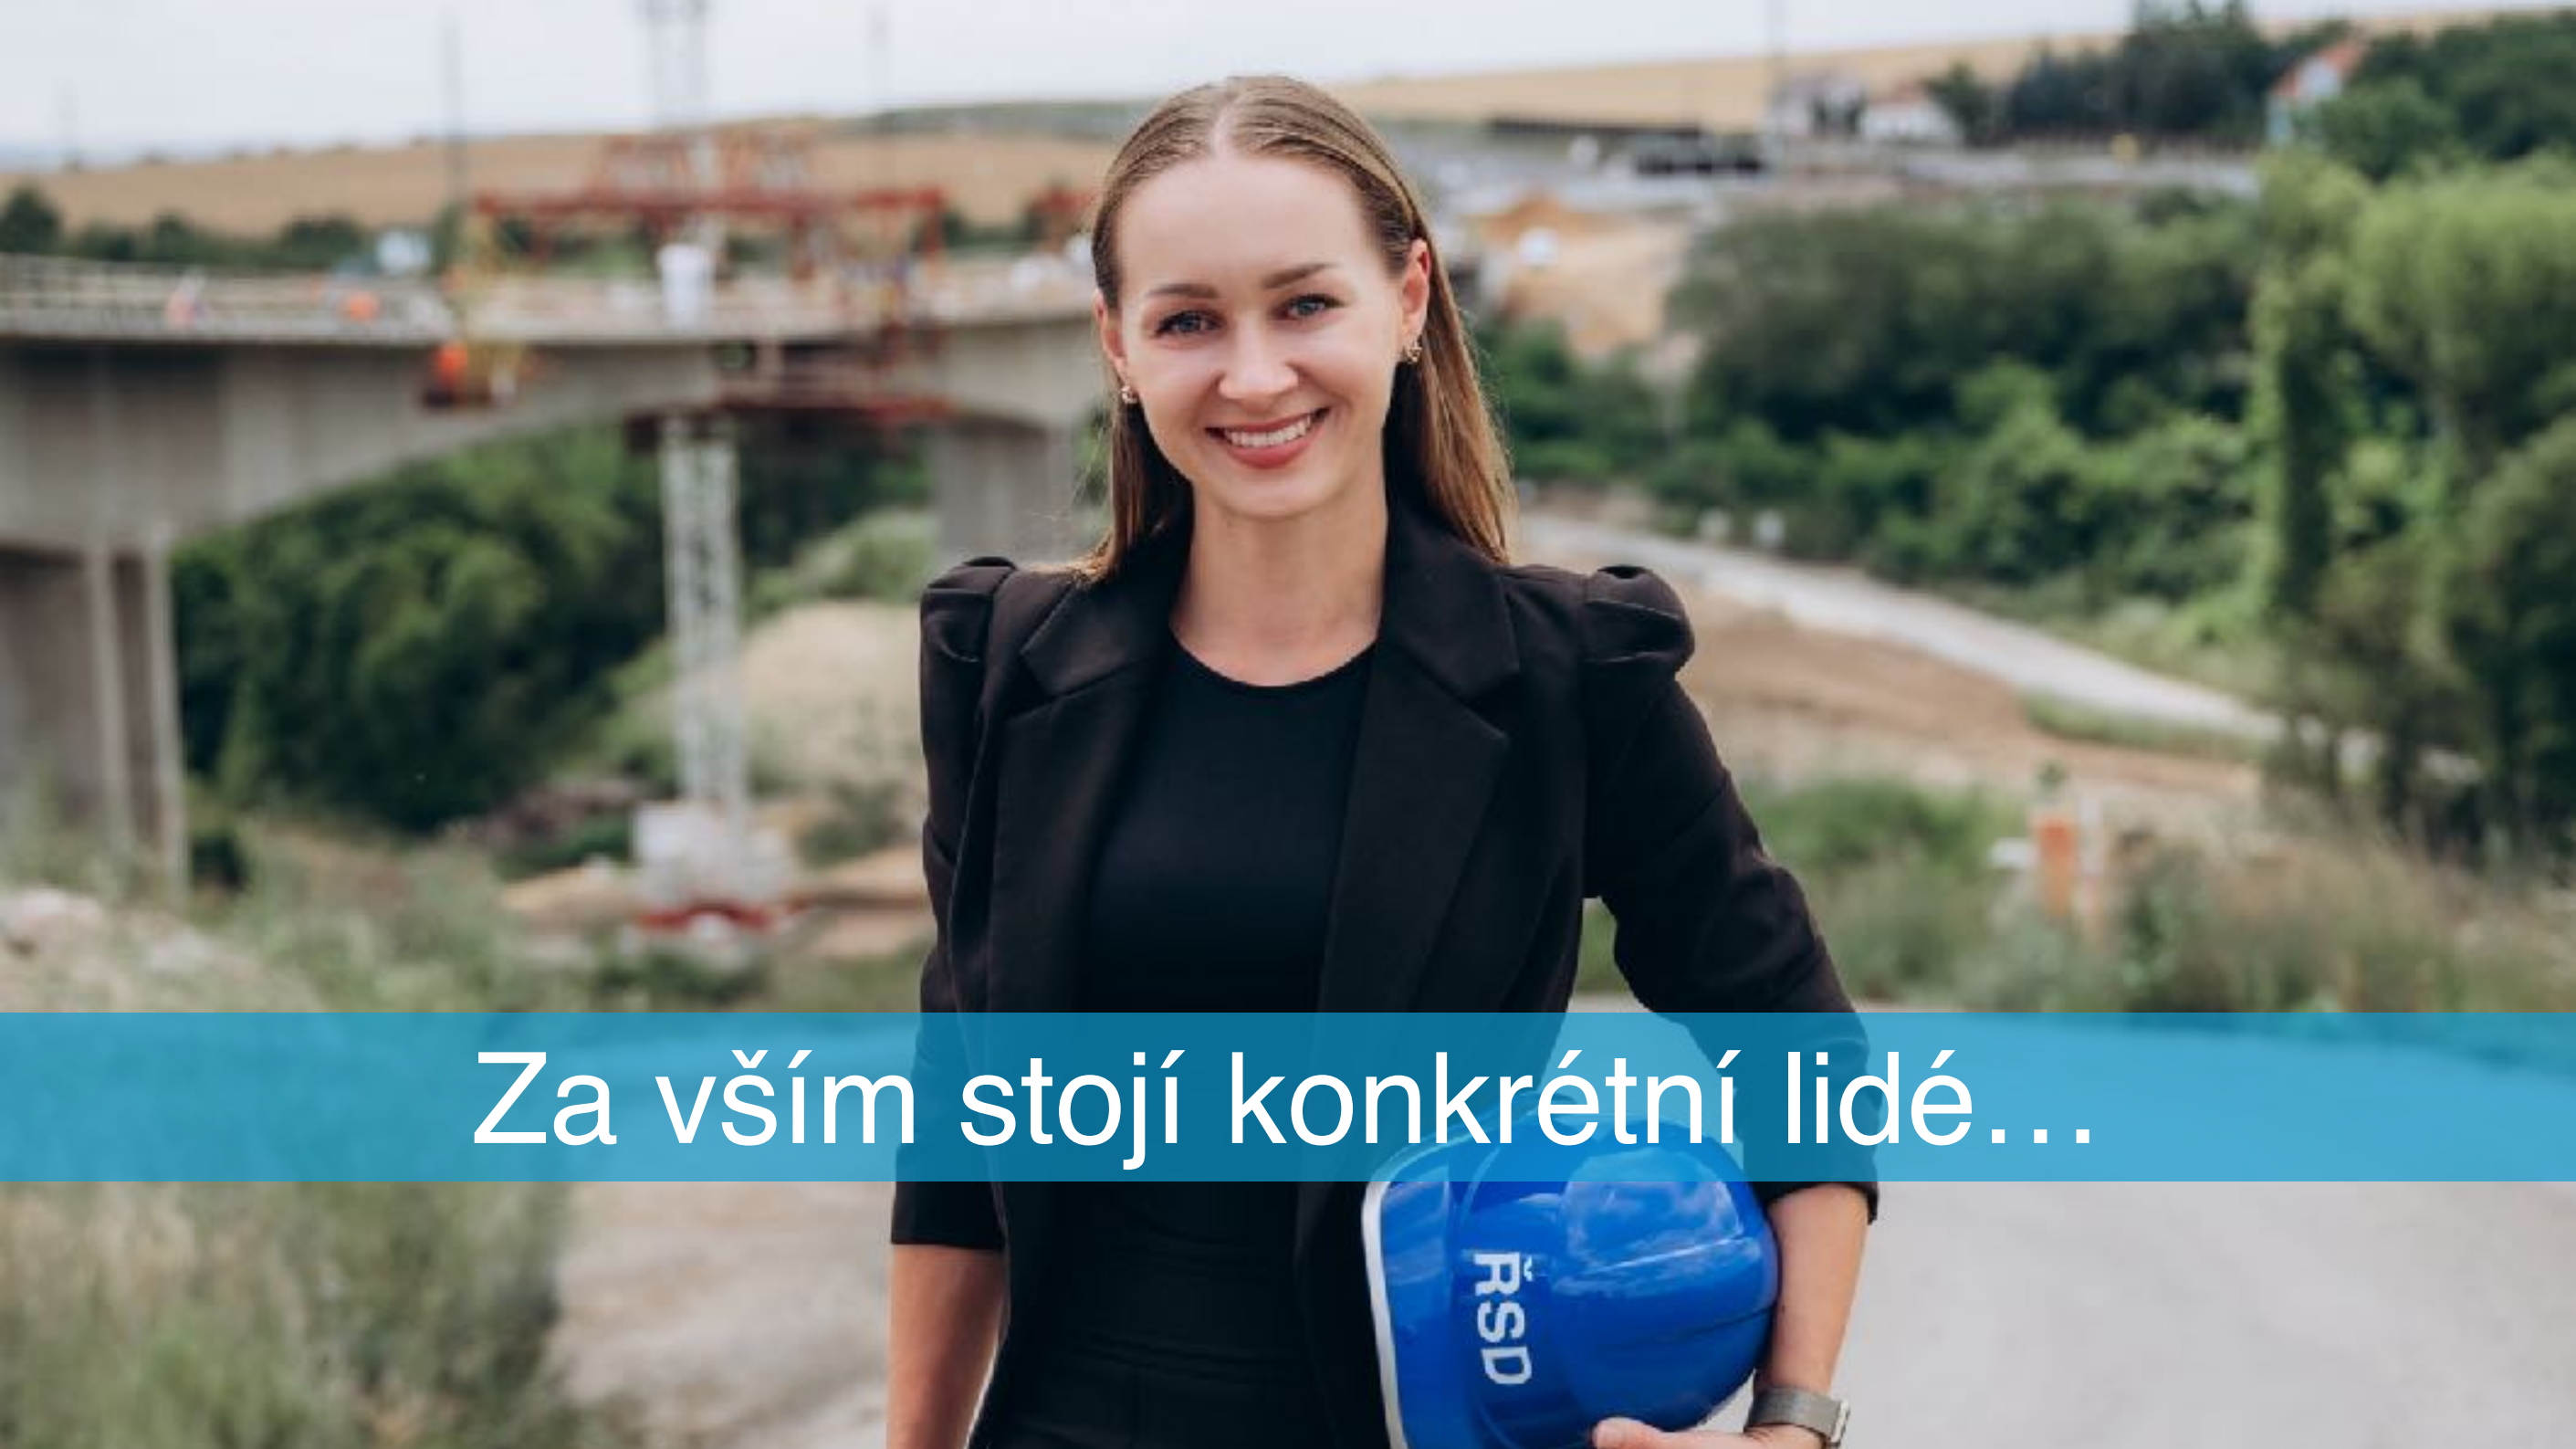A woman with long brown hair, wearing a black blazer over a black top, is smiling and holding a blue hard hat with the letters 'ŘSD' on it. She is standing in front of a construction site with a bridge under construction and greenery in the background.

Za vším stojí konkrétní lidé...

Děkuji za pozornost

Ing. Radek Mátl
generální ředitel ŘSD s. p.
